

GPMS — TCC00363

FinApp

Controle Financeiro Pessoal

RODADA 1 · PLANEJAMENTO

Filipe · Sara · Emanuel · Arben · Enzo · Giovana

Profa. Rebeca Motta

O problema e a proposta de valor

PROBLEMA

Pessoas físicas perdem a visibilidade sobre para onde o dinheiro vai. Ferramentas existentes são complexas demais ou lentas — o que faz o hábito de controle financeiro ser abandonado antes de criar consistência.

PROPOSTA DE VALOR

Uma solução web simples e centralizada para registrar receitas e despesas, priorizando velocidade de uso e clareza visual dos padrões de consumo — sem a sobrecarga dos apps bancários tradicionais.

CRITÉRIO DE SUCESSO DA RODADA 1

Entregar um MVP com o RF01 (Gerenciar Transações) operando de ponta a ponta.

< 30s

tempo-alvo para registrar
uma transação (RNF01)

< 3s

tempo-alvo de carregamento
dos relatórios (RNF02)

Para quem estamos construindo

Personas levantadas na fase de Engenharia de Requisitos (ES)

H

Henrique Gonçalves

Estudante universitário, 23 anos · renda limitada

Necessidade principal:

Controlar pequenos gastos diários com um registro rápido — sem fricção, sem telas complexas.

Empuxa o produto para: simplicidade e velocidade (RNF01).

L

Laura Varges

Jovem profissional, 27 anos · salário estável

Necessidade principal:

Economizar para viagens e metas maiores; quer análises mais profundas dos próprios gastos.

Empuxa o produto para: relatórios, metas e exportação (RF03–RF05).

Escopo do produto

Requisitos RF01–RF05 · limitado por decisão explícita de escopo

DENTRO DO ESCOPO

- ✓ RF01 · Gerenciar Transações (receitas e despesas)
- ✓ RF02 · Gerenciar Categorias (padrão e personalizadas)
- ✓ RF03 · Visualizar Relatórios mensais e por categoria
- ✓ RF04 · Gerenciar Metas de Economia
- ✓ RF05 · Exportar Dados em CSV

FORA DO ESCOPO (NESTA FASE)

- ✗ Autenticação e conta de usuário
- ✗ Sincronização bancária automática
- ✗ Controle de investimentos
- ✗ Gestão avançada de cartão de crédito
- ✗ Orçamento futuro detalhado / dívidas
- ✗ Aplicativos móveis nativos

Escopo do projeto (EAP)

34 pacotes de trabalho organizados em 4 macro-fases, com IDs rastreáveis por todos os artefatos



A Rodada 1 cobre as fases 1 e 2 por completo, mais o início da fase 3 (transações e categorias) — marco: Demo v1.


Papéis e responsabilidades

Alocação orientada à experiência de cada membro no projeto de Engenharia de Software

Membro	Papel	Principais responsabilidades
Filipe	Gerente de Projeto (GP)	Cronograma, orçamento, EVM/burndown, consolidação do plano
Sara	Product Owner (PO)	Backlog, priorização de requisitos, visão do produto
Emanuel	Scrum Master	Cerimônias ágeis, Planning Poker, remoção de impedimentos
Arben	Config. / Gerente de Configuração	Git/GitHub, estratégia de branches, issues e milestones
Enzo	Desenvolvedor	Implementação, modelagem de dados, estimativas técnicas
Giovana	Desenvolvedora	Implementação backend, regras de negócio, validações

Estimativas de esforço (Planning Poker)

Escala Fibonacci · 34 pacotes de trabalho estimados pela equipe

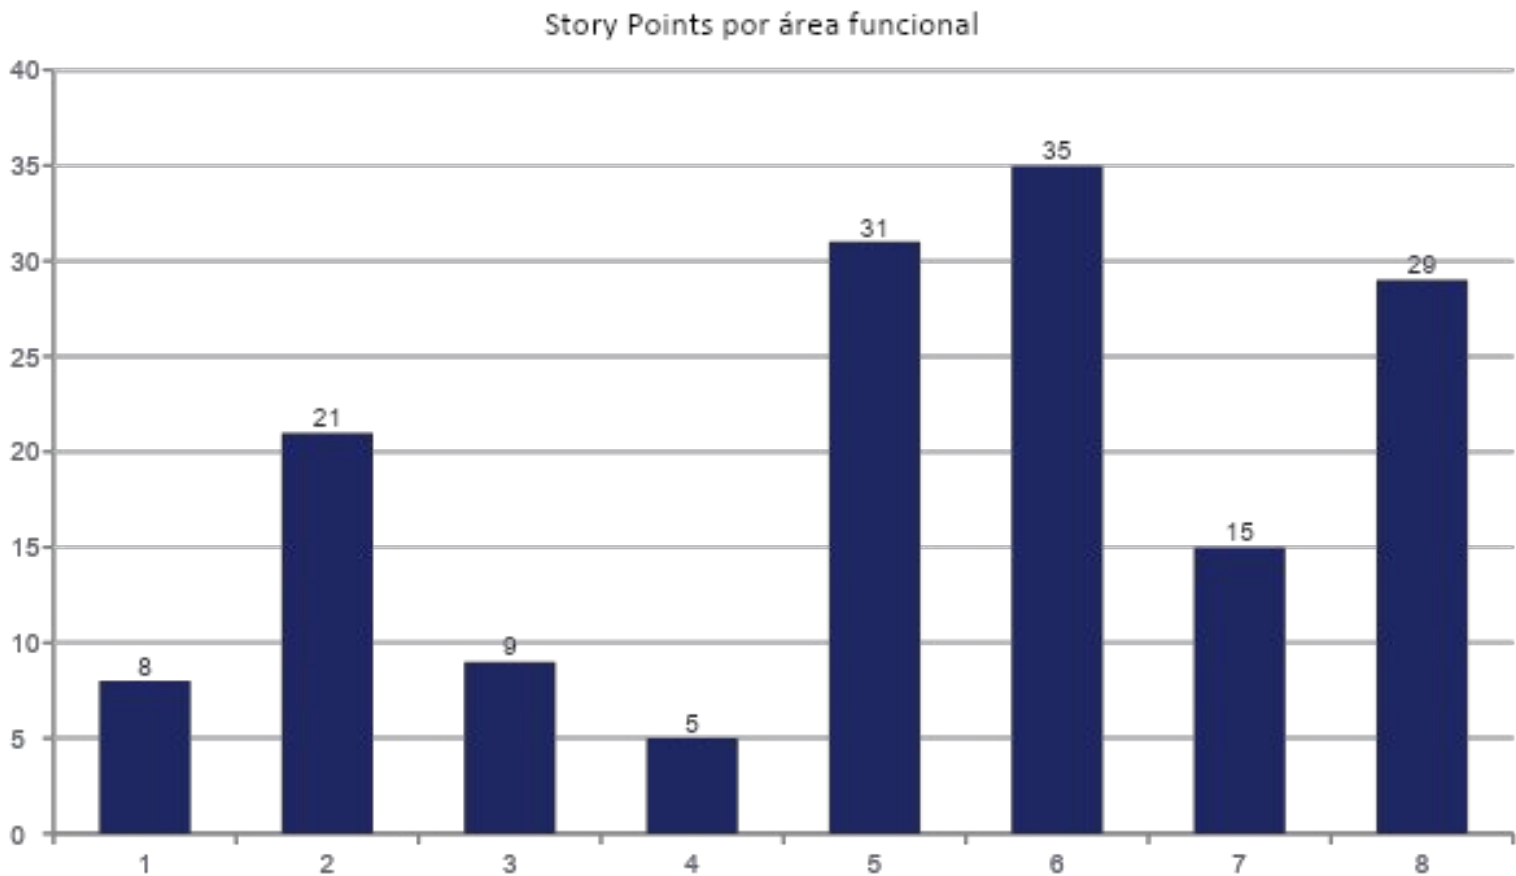

153


Story Points totais
(≈ 612 horas estimadas)

R\$ 30.600

orçamento estimado
(premissa: R\$ 50/h)

Cronograma do projeto

Gráfico de Gantt escolhido para expor dependências e o caminho crítico entre pacotes da EAP

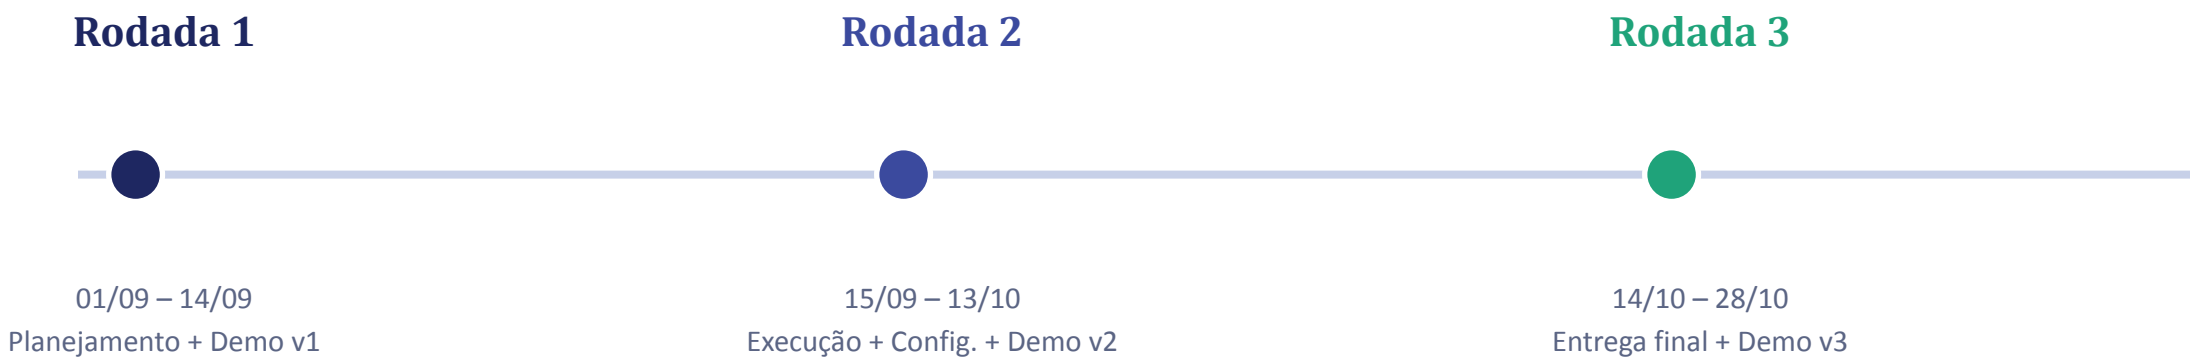

Por que Gantt?

Visualiza precedências e paralelismo entre pacotes, ajudando o GP a identificar o caminho crítico e agir antes de um gargalo virar atraso.

Baseline orçamentária

612h estimadas × R\$ 50/h = R\$ 30.600 ao longo do semestre, distribuídas nas 3 rodadas conforme a EAP.

Sem margem para retrabalho

Prazo de 1 semestre exige priorizar RF01 antes de qualquer funcionalidade secundária.

Análise de riscos


Top 5 riscos por exposição (Probabilidade × Impacto) — lista completa tem 12 itens

Risco	Exp.	Contenção
Erros nos cálculos de saldo/totais/agrupamentos	20	Testes automatizados centralizados nas regras de cálculo
Integração incorreta entre receitas e metas	20	Regras definidas antes da implementação + testes de integração
Atrasos na implementação e integração final	20	Marcos intermediários e acompanhamento por Story Points
Aumento não planejado do escopo	16	Controle de mudanças com avaliação de impacto antes de aprovar
Grande volume de correções perto da demo	16	Testes e integração contínuos, não concentrados no final

Faixas de exposição:  16–25 Crítico  12–15 Alto  1–10 Moderado/Baixo

Monitoramento e controle

Burndown e EVM já estabelecidos como baseline desde a Rodada 1

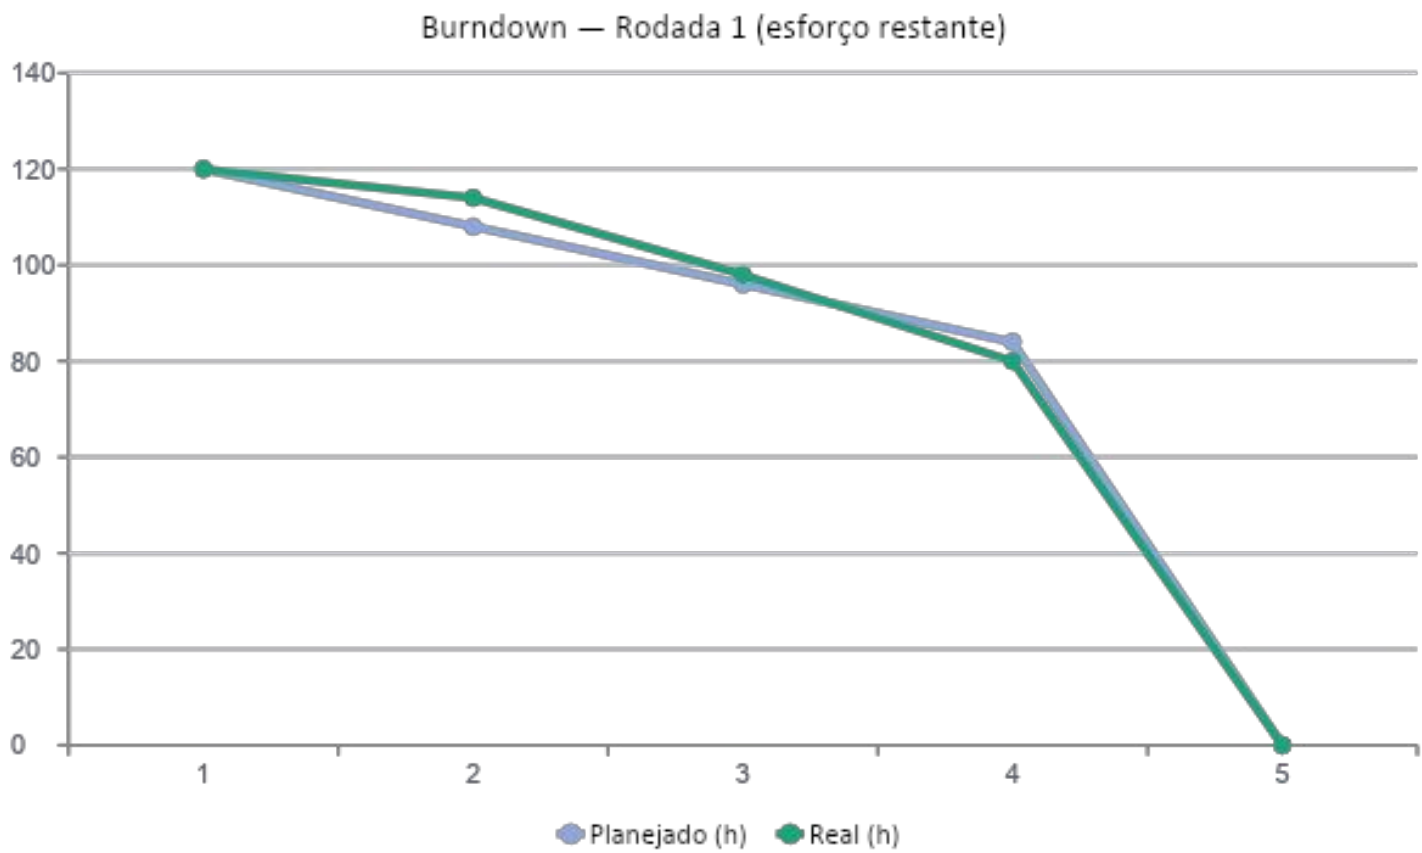

SPI 1.00

CPI 1.00

Índices de desempenho de prazo e custo — projeto no prazo e dentro do orçamento na baseline inicial

O desvio do Dia 1 (114h reais vs. 108h planejadas) veio do setup de infraestrutura. O ritmo normalizou no Dia 2, e o ganho do Dia 3 absorveu o tempo gasto alinhando a regra de validação de datas do RF01.

Decisão técnica em destaque

ADR 001 · Validação de data em transações (RF01 / UC01)

PROBLEMA

O UC01 pede para bloquear "datas anteriores ao cadastro" — mas o escopo (RF01–RF05) não inclui entidade Usuario/autenticação.

Interpretar de forma literal geraria scope creep.

OPÇÕES AVALIADAS

1. Bloquear apenas datas futuras
2. Bloquear datas anteriores ao registro (sem backdating)
3. Criar entidade Usuario só para guardar dataCadastro

DECISÃO


Opção 1

data ≤ hoje

Preserva a usabilidade (RNF01), permite registrar gastos retroativos e não expande o escopo aprovado.

Demonstração v1

CRUD de Transações e Categorias · Kotlin + Spring Boot + JPA/H2

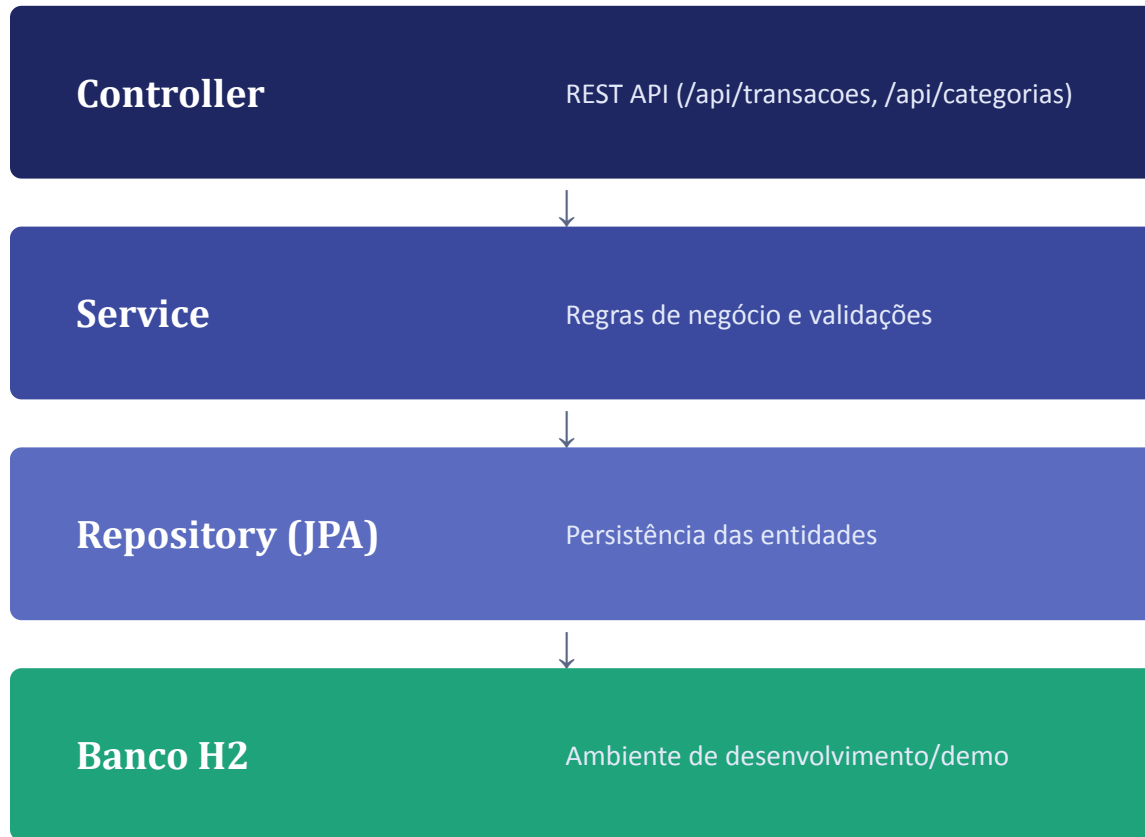

Endpoints implementados

POST

/api/transacoes

GET

/api/transacoes

GET

/api/transacoes/{id}

PUT

/api/transacoes/{id}

DELETE

/api/transacoes/{id}

**GET / POST /
PUT / DELETE**

/api/categorias

Validações: valor > 0 · data ≤ hoje · categoria obrigatória · erros tratados via
GlobalExceptionHandler

Próximos passos — Rodada 2

1

Configuração

Estratégia de branches ativa + Issues/Milestones no GitHub

2

Execução

Concluir RF01/RF02 e iniciar RF03 (relatórios)

3

Monitoramento

Atualizar burndown e EVM acumulados da rodada

Obrigado!

Filipe · Sara · Emanuel · Arben · Enzo · Giovana
