

RODADA 2 · EXECUÇÃO E CONFIGURAÇÃO

FinApp

Controle Financeiro Pessoal

Filipe · Sara · Emanuel · Arben · Enzo · Giovana



EQUIPE

Papéis e responsabilidades

Membro	Papel	Entregas na Rodada 2
Filipe	Gerente de Projeto	EVM, burndown, Gantt e orçamento
Sara	Product Owner	Backlog, escopo e registro RDT-01
Emanuel	Scrum Master	Riscos, atas e impedimentos
Arben	Gerente de Configuração	Branches, Issues e repositório
Enzo	Desenvolvedor	Docker, schema e relatório mensal (RFO3)
Giovana	Desenvolvedora	RFO1, RFO2 e testes das regras de cálculo

Git e estratégia de branches

Fluxo

A main é protegida. Toda mudança entra por Pull Request com revisão de outro integrante.

Branches

Uma branch por Issue, criada a partir da main.

```
feature/#8-seed
```

Commits e PRs

Commits pequenos, ligados à Issue. O PR fecha a Issue ao ser aceito.

```
feat(cat): seed #8
```

ESTRATÉGIA ADOTADA

GitHub Flow

Justificativa: Equipe enxuta de 6 pessoas, com integração contínua (iterações rápidas), priorizando a branch 'main' sempre protegida e em estado de produção

GitHub Issues e repositório

20

Issues planejadas para a iteração 2

8

Labels: feature, infra, teste, gestão, demo, config, bug e mudança de escopo

3

Milestones, um por iteração e rodada

Repositório

https://github.com/ArbenTafili/finapp_Uff

Cada Issue indica o pacote da EAP (PTxx), as horas previstas e os critérios de aceite. A Issue #4 registra a decisão técnica RDT-01.

EVM acumulado


Indicador	Iteração 1	Iteração 2	Acumulado
PV (h)	[120]	[180]	[300]
EV (h)	[120]	[184]	[304]
AC (h)	[120]	[190]	[310]
SPI	[1,02]	[1,01]	[__]
CPI	[0,97]	[0,98]	[__]
CV	[0]	[-6h]	[-6h]
SV	[0]	[+4h]	[+4h]

Baseline: 153 SP · 612 h · R\$ 30.600 (R\$ 50/h). SPI acima de 1 indica adiantamento; CPI acima de 1 indica custo abaixo do planejado.

Burndown da iteração 2

Gráfico de esforço restante

Horas restantes por dia, planejado × real, a partir da planilha de horas do time.

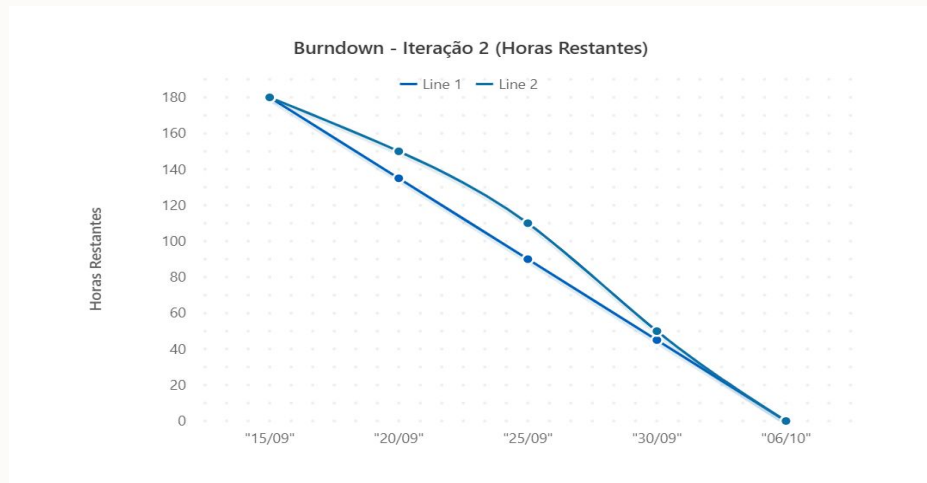

Leitura

Situação: **Sprint finalizada hoje (06/10) com cronograma levemente adiantado (SV +4h). Desvio de custo (CV -6h) contido no limite.**

Causa do desvio: **Esforço extra (~8h) alocado no setup e curva de aprendizado do Docker/PostgreSQL (RDT-01).**

Ação corretiva: **Ambiente 100% estabilizado para a Rodada 3.**

PostgreSQL via Docker

ANTES

RNFO3 do documento de ES:
armazenamento local dos
dados.

DECISÃO

PostgreSQL em contêiner
Docker, executado localmente.

POR QUÊ

Alinhamento com as escolhas
técnicas do projeto: Kotlin,
Spring Boot e JPA.

NOVA REDAÇÃO DO RNFO3

Os dados devem ser armazenados em banco de dados executado localmente (Docker), sem envio a serviços externos.

Impacto em prazo e custo: **+8h de esforço reabsorvidas na iteração (+R\$ 0 externos)** · Rastreabilidade: Issue #4

Linha do tempo das rodadas

Rodada 1

01/09 – 14/09

Concluída

Rodada 2

15/09 – 06/10 (Concluída)

Em andamento

Rodada 3

07/10 – 28/10

Próxima

BASELINE

612 h · R\$ 30.600

153 SP a R\$ 50/h

ATUALIZADO

[624,5 h] · [R\$ 31.225]

Após a iteração 2

O QUE MUDOU

A Rodada 2 foi encerrada com sucesso hoje (06/10). Entrega total dos RF01/RF02 e adiantamento do RF03. O EAC ajustou levemente para R\$ 31.225 devido ao setup do Docker.

Reavaliação dos riscos

Risco	Exp. R1	Status
Erros nos cálculos de saldo, totais e agrupamentos	20	[Monitorado]
Integração incorreta entre receitas e metas	20	[Monitorado]
Atrasos na implementação e integração final	20	[Monitorado]
Novo: instalar e configurar Docker e PostgreSQL	16 (Crítico)	Novo risco

Exposição = probabilidade × impacto. Faixas: 16–25 crítico · 12–15 alto · 1–10 moderado ou baixo.

Contenção do novo risco: README com passo a passo e docker-compose.yml pronto.

Contingência: **[Manter perfil "fallback" para executar o banco em memória (H2) via Spring Boot caso o contêiner Docker falhe no PC do avaliador.Manter perfil "fallback" para executar o banco em memória (H2) via Spring Boot caso o contêiner Docker falhe no PC do avaliador.]**

O que será mostrado

RF01

Transações

Cadastrar, editar e excluir receitas e despesas, com validação de valor e data.

Status: [100% Concluído]

RF02

Categorias

Categorias padrão
pré-carregadas, categorias personalizadas e regras de exclusão.

Status: [100% Concluído (com seeds)]

RF03 · PARCIAL

Relatório mensal

Totais de receitas, despesas e saldo do mês, com distribuição por categoria.

Status: [100% Concluído (com seeds)]

Stack: Kotlin + Spring Boot + JPA + PostgreSQL (Docker)

Roteiro de 5 minutos, com dados de exemplo já preparados.

Horas previstas × realizadas

Membro	Previstas (h)	Realizadas (h)	EV (h)
Filipe	[28]	[28]	[28]
Sara	[26]	[26]	[26]
Emanuel	[26]	[24]	[24]
Arben	[30]	[34]	[32]
Enzo	[34]	[42]	[38]
Giovana	[36]	[36]	[36]
Total	[180]	[190]	[184]

Fonte: planilha de horas por tarefa, ligada às Issues. PV e EV individuais seguem a mesma técnica de EVM do projeto.

Rodada 3: entrega final

- 1 Demo v3 da versão final do produto
- 2 Concluir RFO3 e entregar RFO4 (metas) e RFO5 (exportação CSV)
- 3 Burndown e EVM consolidados de todas as iterações
- 4 Dificuldades e decisões técnicas, retrospectiva final e registro de participação consolidado

Obrigado!
