UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE — UFF

Instituto de Computação · Gerência de Projetos e Manutenção de Software (GPMS)

Professora: Rebeca Campos Motta · Semestre 2026.2

FinApp — Gestão Financeira Pessoal

Plano de Projeto Consolidado e Relatório de Encerramento

ENTREGA FINAL · RODADAS 1, 2 E 3 INTEGRADAS

Equipe de Desenvolvimento e Gestão:

- **Filipe Moreira** — Gerente de Projeto (GP) & Dev
- **Sara Marcomini** — Product Owner (PO)
- **Emanuel** — Scrum Master
- **Arben Tafili** — Gerente de Configuração
- **Enzo** — Desenvolvedor (Infra/DB/Fullstack)
- **Giovana** — Desenvolvedora (Backend/Frontend)

Data de Consolidação: 28/10/2026

Status: 100% Entregue & Homologado

Baseline Global: 153 SP · 612 h · R$ 30.600

Repositório: GitHub (main branch)

Sumário Executivo do Projeto

Seção 1. Documento de Visão e Requisitos (RF01 a RF05 e RNF01 a RNF05)

Seção 2. Backlog do Produto e User Stories Refinadas

Seção 3. Escopo do Projeto e Diagrama Hierárquico da EAP (WBS)

Seção 4. Estimativas de Esforço (Planning Poker e Story Points)

Seção 5. Cronograma Detalhado (Gantt) com Análise de Prazos e Atrasos

Seção 6. Detalhamento Completo do Orçamento (Por EAP e Por Membro)

Seção 7. Monitoramento e Controle (EVM Acumulado, Curva S e Burndowns)

Seção 8. Gestão de Riscos (Matriz de Riscos e Planos de Mitigação)

Seção 9. Decisões Técnicas e Arquitetura (ADR 001, ADR 002 e RDT-01 Docker/Postgres)

Seção 10. Gerência de Configuração, Branches e Auditoria do Repositório

Seção 11. Histórico de Versões e Integração das Entregas Técnicas

Seção 12. Roteiro da Demonstração v3, Publicação em Nuvem e Conta de Teste

Seção 13. Registro de Participação Individual e Esforço Consolidado (Horas e Commits)

Seção 14. Retrospectiva Final (Roteiro em Vídeo, Lições Aprendidas e Conclusão)

1. Documento de Visão e Requisitos

Documento de Visão — FinApp

Responsável: Sara (PO)

1. Problema

Pessoas físicas têm dificuldade em manter um acompanhamento claro de para onde seu dinheiro está indo. Essa falta de visibilidade leva a gastos excessivos, baixo índice de poupança e dificuldade em alcançar objetivos financeiros. As alternativas existentes no mercado costumam ser complexas demais ou não oferecem um método simples e rápido de registro — o que faz muitos usuários abandonarem o hábito de controlar as finanças antes mesmo de criar consistência.

2. Objetivo e Proposta de Valor

O FinApp propõe uma solução web, simples e centralizada para registro de receitas e despesas, com foco em velocidade de uso (registrar uma transação em menos de 30 segundos) e em clareza visual dos padrões de consumo. A proposta de valor central é: Dar ao usuário controle sobre sua vida financeira sem exigir esforço, tempo ou conhecimento técnico — o oposto das planilhas complexas e dos apps bancários sobrecarregados de funcionalidades que ele não usa.

3. Público-alvo / Personas

Definido a partir das personas levantadas na fase de Engenharia de Requisitos: Persona Perfil Necessidade principal Henrique Gonçalves - Estudante universitário, 23 anos, renda limitada. Controlar pequenos gastos diários com registro rápido. Laura Varges - Jovem profissional, 27 anos, salário estável. Economizar para viagens e metas maiores; análises mais profundas. O produto atende dois perfis complementares: o usuário que precisa de simplicidade no dia a dia e o usuário que demanda planejamento de médio prazo.

4. Principais Funcionalidades (visão de alto nível)

Registro de transações: Lançar receitas e despesas de forma rápida. Organização por categorias: Categorias padrão e personalizadas. Relatórios visuais: Entendimento dos padrões de consumo por mês e categoria. Metas de economia: Definição e acompanhamento de objetivos financeiros. Exportação de dados: Extração das transações (CSV) para uso em ferramentas externas.

5. Restrições Conhecidas

Restrição de equipe: Projeto executado por 6 pessoas com níveis de experiência distintos. A distribuição de tarefas considerará a curva de aprendizado, não apenas a divisão igualitária de esforço. Restrição de prazo: Desenvolvimento limitado à duração de um semestre letivo; não há margem para escopo inflado ou retrabalho extenso. Restrição tecnológica: Solução web compatível com Chrome, Firefox e Safari (RNF04). Sem sincronização bancária automática ou apps nativos nesta versão. Restrição de dados: Armazenamento local

por questões de privacidade (RNF03), limitando funcionalidades dependentes de back-ends centralizados robustos.

6. Critérios de Sucesso do Projeto

Entregar um MVP funcional com o RF01 (Gerenciar Transações) operando de ponta a ponta antes do fim do semestre. Cumprir os requisitos não funcionais de usabilidade (RNF01) e desempenho (RNF02). Validar com pelo menos uma das personas (ou perfil equivalente) que o fluxo de registro é percebido como rápido e simples. Concluir o ciclo de modelagem, implementação e entrega dentro do prazo, sem reduzir o escopo essencial por atraso.

2. Backlog do Produto e Priorização

Backlog e Priorização — Rodada 2 — FinApp

Responsável: Sara Marcomini (Product Owner)

Base de código: `main`, versão `c86694f`.

Objetivo e ponto de partida

A rodada 2 tem como objetivo concluir RF01 (Transações) e RF02 (Categorias) e entregar as consultas e o endpoint mensal de RF03 (Relatórios). A Demo v1, com CRUD de transações e categorias, é o ponto de partida.

Este backlog atende à Issue #24. Os critérios de aceite e o roteiro da Demo v2 estão vinculados à Issue #25.

Backlog por rodada

P1 indica prioridade de conclusão na rodada 2; P2 indica a entrega parcial de relatórios nessa rodada. Os itens reservados para a rodada 3 terão sua ordem detalhada no planejamento daquela rodada.

Requisito	Entrega prevista	Prioridade	Rodada	Responsável técnico	Situação
RF01 — Gerenciar Transações	Concluir CRUD; validar valor positivo com até duas casas decimais, categoria obrigatória e `data <= hoje`; conferir saldo e erros de entrada.	P1	2	Giovana	Integrado à main — PR #43.
RF02 — Gerenciar Categorias	Concluir seed idempotente e CRUD de categorias personalizadas; bloquear edição/exclusão de padrão, exclusão de categoria vinculada e alteração incompatível de tipo; tratar nomes duplicados por tipo e integrar às transações.	P1	2	Giovana	Integrado à main — PR #43.
RF03 — Relatórios (parcial)	Consultas e endpoint mensal com receitas, despesas, saldo e distribuição de despesas por categoria; validar resultados e medir RNF02.	P2	2	Enzo	Integrado à main — PRs #36/#37.
RF01/RF02 — Correções	Corrigir falhas identificadas no aceite ou na integração; preservar o funcionamento dos fluxos entregues.	Conforme falhas identificadas	3	Giovana	Planejado
RF03 — Relatórios (conclusão)	Completar interface, gráficos e navegação entre meses, com validação integrada dos requisitos de desempenho e precisão.	Reservado para a rodada 3	3	A definir pela equipe	Planejado
RF04 — Metas de Economia	Implementar criação, acompanhamento, edição e exclusão/cancelamento de metas, progresso, estados e integração com transações.	Reservado para a rodada 3	3	A definir pela equipe	Planejado
RF05 — Exportação CSV	Implementar filtro de período, geração e disponibilização de CSV com colunas padronizadas e validação do conteúdo.	Reservado para a rodada 3	3	A definir pela equipe	Planejado

Rastreabilidade com a EAP

A tabela relaciona os IDs do escopo revisado, os pacotes de estimativa PTxx e as Issues da rodada 2.

Entrega da rodada 2	IDs da EAP	Pacotes PT da divisão de trabalho	Issues relacionadas
Infraestrutura de persistência e execução	2.2 e 2.4	PT01–PT02	#14 — Docker Compose e perfis, #15 — Schema monetário
RF01	3.1.1–3.1.7	PT03–PT08	#16 — Transações
RF02 e integração Categoria × Transação	3.2.1–3.2.6	PT09–PT12	#17 — Categorias, #18 — Integração
RF03 parcial	3.3.1–3.3.3; medição de desempenho vinculada a 3.3.7	PT13–PT18, com entrega parcial nesta rodada	#19 — Queries, #20 — Endpoint mensal
Testes das regras de cálculo	4.1, com apoio aos fluxos de 4.2–4.3	PT30–PT34, conforme divisão de testes da equipe	#21 — Testes de cálculo
Preparação e ensaio da Demo v2	4.8	Fase 4	#29 — Preparar e ensaiar a Demo v2

Os pacotes 3.3.4–3.3.6 e a conclusão de 3.3.7 ficam para a rodada 3, junto de 3.4 (Metas) e 3.5 (Exportação CSV).

Implementação e integração

Issues	Implementação	Integração
#14/#15	Compose, perfis e schema NUMERIC(19,2); PR #34 e PR #35.	Main
#17	Seed idempotente, nomes únicos por tipo e regras de categoria; PR #39.	Main, pelo PR #43
#18	Compatibilidade entre o tipo da transação e o da categoria; PR #40.	Main
#16	Precisão de entrada, descrição, tratamento de erros e endpoint de saldo; PR #41.	Main, pelo PR #43
#21	Testes unitários de cálculo e precisão; PR #42.	Main, pelo PR #43
#19/#20	Queries e endpoint mensal; PR #36 e PR #37.	Main
#29	Massa D1–D4 e preparação técnica; PR #38.	Documento e massa de demonstração na main

O fluxo de publicação é branch criada a partir da main → PR para develop → main.

As regras de categorias estão descritas no ADR 002. A persistência local está registrada no RDT-01.

Revisão do escopo e justificativas

- **Priorização:** o início de RF04, previsto na distribuição inicial da EAP para a rodada 2, foi transferido para a rodada 3. A justificativa é concentrar a execução na conclusão de RF01/RF02 e na entrega parcial

de RF03. RF04 permanece no escopo total do produto.

- **RF03 parcial:** a rodada 2 cobre consultas e endpoint mensal, já integrados à main. Os campos `mesAnterior` e `proximoMes` estão disponíveis na API; a interface completa, os gráficos e a navegação visual permanecem na rodada 3.
- **RNF03:** "Os dados devem ser armazenados em banco de dados executado localmente (Docker), sem envio a serviços externos." A decisão está no RDT-01, vinculado à Issue #13.
- **ADR 001:** preservar a regra `data <= hoje`, permitindo registros retroativos e bloqueando datas futuras. ADR 001 e RDT-01 são registros distintos.
- **Impactos:** a transferência de metas reorganiza o trabalho entre rodadas. O acompanhamento de horas e custo está no Monitoramento e Controle; a revisão de cronograma e orçamento está vinculada à Issue #23.


Limites preservados

O produto continua limitado a RF01–RF05 e RNF01–RNF05. Permanecem fora do escopo autenticação/Usuario, sincronização bancária, investimentos, gestão avançada de cartão de crédito, orçamento futuro detalhado, empréstimos/dívidas e aplicativos móveis nativos.

Cobertura dos critérios da Issue #24

Critério de aceite da Issue	Onde está documentado
Itens da Iteração 2 revisados	Tabela de backlog por rodada e separação de RF03 parcial/conclusão.
Prioridades atualizadas	P1 para concluir RF01/RF02 e P2 para RF03 parcial.
Itens fora do escopo identificados	Limites preservados e itens reservados para a rodada 3. RF04/RF05 continuam no escopo total.
Mudanças relevantes possuem registro	Justificativa da transferência de metas, revisão do escopo e RDT-01 vinculado à Issue #13.
Backlog coerente com as Issues da Rodada 2	Tabelas de rastreabilidade e integração, com os links das Issues e dos PRs.
Escopo da Demo v2 definido	RF01/RF02 e RF03 parcial; critérios e roteiro vinculados à Issue #25.

3. Escopo do Projeto e Estrutura Analítica (EAP)

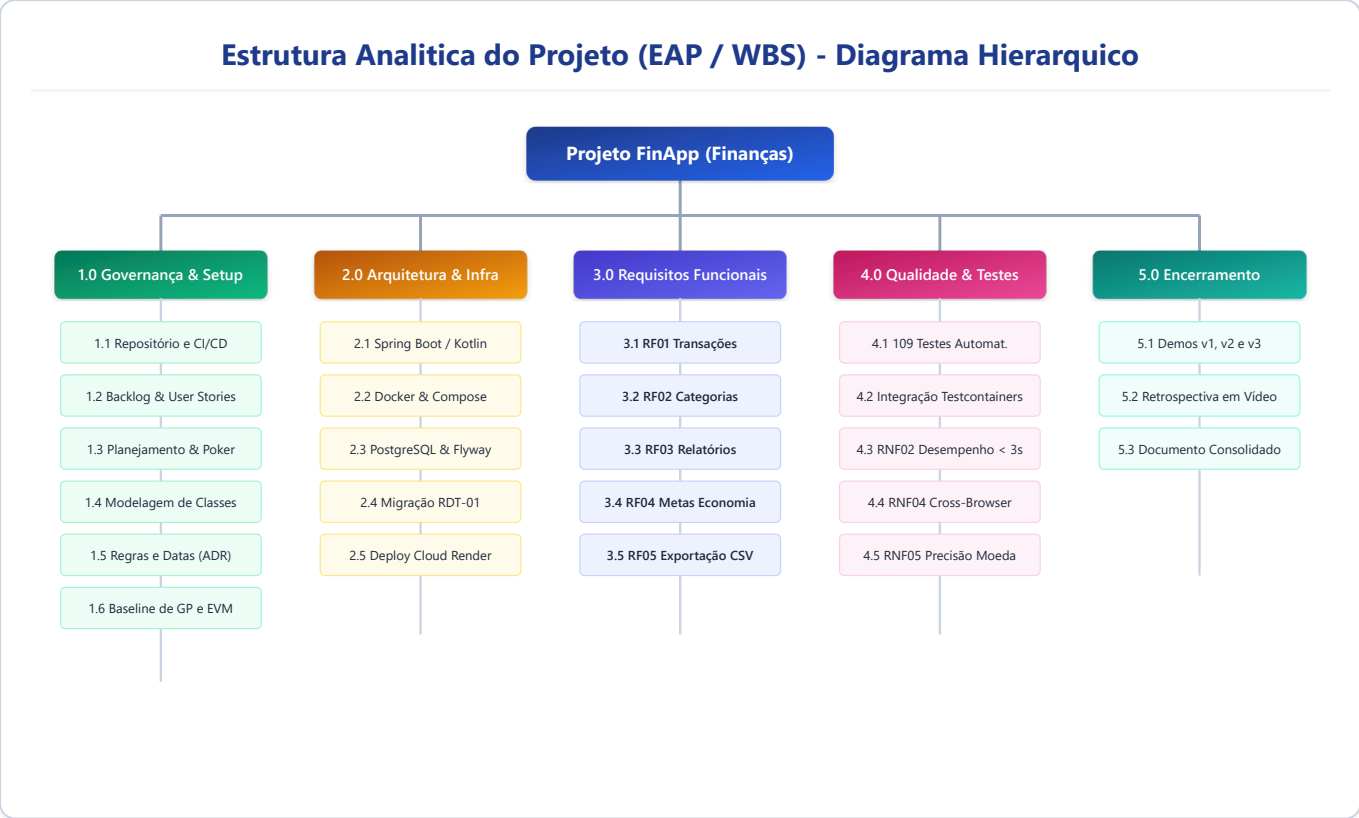

Escopo do Produto e EAP — Revisão da Rodada 2 — FinApp

Responsável: Sara Marcomini (Product Owner)

Esta revisão atualiza a seção 2 do Plano de Projeto para a rodada 2, a partir do CRUD de transações e categorias da Demo v1. A distribuição das entregas está no backlog, e a versão anterior está no documento da rodada 1.

Issue da revisão: #24 — Revisar backlog e escopo da Iteração 2.

Escopo do Produto (requisitos)

RF01 — Gerenciar Transações

Permitir que o usuário registre receitas e despesas informando valor, tipo (receita/despesa), categoria, data e descrição opcional. O sistema deve permitir também edição e exclusão das transações cadastradas.

Para a validação da data, será adotada a regra de que a transação pode possuir data passada ou a data atual, mas **não pode possuir data futura** (`data <= hoje`). Essa interpretação preserva a possibilidade de registrar despesas retroativas sem introduzir autenticação ou entidade de usuário fora do escopo atual.

RF02 — Gerenciar Categorias

Disponibilizar categorias padrão pré-carregadas e permitir que o usuário crie, edite e exclua categorias personalizadas.

As regras descritas no ADR 002 incluem seed idempotente, nome único por tipo sem distinção entre maiúsculas/minúsculas, categorias padrão imutáveis e bloqueio de exclusão ou mudança de tipo de categoria vinculada. O tipo da transação deve corresponder ao da categoria. Essas regras estão implementadas na main.

RF03 — Visualizar Relatórios

Permitir a visualização de relatórios mensais contendo total de receitas, total de despesas, distribuição de gastos por categoria e navegação entre meses.

RF04 — Gerenciar Metas de Economia

Permitir que o usuário crie metas de economia com valor alvo e prazo, acompanhe visualmente seu progresso e possa editar ou excluir/cancelar metas existentes.

RF05 — Exportar Dados

Permitir a exportação das transações para arquivo CSV, com seleção de intervalo de datas e colunas padronizadas.

Requisitos não funcionais relacionados

- **RNF01 — Usabilidade:** o registro de uma transação deve poder ser realizado em menos de 30 segundos.
- **RNF02 — Desempenho:** o carregamento dos relatórios deve ocorrer em menos de 3 segundos.
- **RNF03 — Segurança/Privacidade:** Os dados devem ser armazenados em banco de dados executado localmente (Docker), sem envio a serviços externos.
- **RNF04 — Compatibilidade:** a interface web deve ser compatível com Chrome, Firefox e Safari.
- **RNF05 — Confiabilidade:** os cálculos financeiros devem preservar precisão e consistência.

Limites de escopo

O desenvolvimento desta versão está limitado aos requisitos RF01 a RF05 e RNF01 a RNF05.

Não fazem parte desta EAP:

- autenticação e gerenciamento de contas de usuário;
- sincronização automática com contas bancárias;
- controle de investimentos;
- gestão avançada de cartões de crédito;
- planejamento orçamentário futuro detalhado;
- gestão de empréstimos ou dívidas;
- aplicativos móveis nativos.

A ausência de autenticação é intencional nesta fase. Não será criada uma entidade `Usuario` apenas para suportar regras que podem ser atendidas sem expansão do escopo.

> Este artefato define o escopo funcional do FinApp e decompõe o trabalho do projeto em pacotes técnicos identificáveis. Os IDs da EAP devem ser reutilizados nos artefatos de estimativas, cronograma, monitoramento e

> registro de participação, garantindo rastreabilidade entre planejamento e execução.

Escopo do Projeto (EAP)

A EAP foi organizada de forma hierárquica para permitir que seus pacotes sejam utilizados diretamente nas estimativas de Planning Poker, no cronograma, no acompanhamento de horas e nas métricas de monitoramento do projeto.

Diagrama da EAP

1. Planejamento, configuração e baseline da Rodada 1

ID EAP	Pacote de Trabalho	Descrição	Requisito relacionado
1.1	Configuração do Repositório e CI/CD	Preparar o repositório Git/GitHub, estratégia de branches, organização de configuração e base para integração contínua e execução do projeto.	Projeto
1.2	Refinamento do Backlog e User Stories	Revisar RF01–RF05, critérios de aceite, prioridades e transformar os requisitos em itens executáveis de backlog.	RF01–RF05
1.3	Planejamento da Rodada e Facilitação	Organizar a primeira rodada, dependências, cerimônias, distribuição inicial de trabalho e preparação para Planning Poker.	Projeto
1.4	Estruturação de Classes e Entidades	Traduzir o modelo existente para a estrutura técnica do código, definindo entidades, responsabilidades e relacionamentos necessários à implementação. Não inclui autenticação ou entidade `Usuario` fora do escopo.	RF01–RF05
1.5	Implementação da Lógica de Datas e Regras	Implementar as regras iniciais de validação de transações, incluindo `valor > 0` e bloqueio de datas futuras (`data <= hoje`).	RF01 / RNF01 / RNF05
1.6	Gestão de Baseline e Documentação de GP	Consolidar a baseline inicial de escopo, cronograma e esforço para permitir acompanhamento de desvios ao longo das rodadas.	Projeto

2. Arquitetura e infraestrutura de implementação

ID EAP	Pacote de Trabalho	Descrição	Requisito relacionado
2.1	Estrutura da Aplicação Spring Boot	Organizar a aplicação Kotlin/Spring Boot em camadas coerentes de domínio, serviço, persistência e interface/API.	Base técnica
2.2	Persistência com JPA/PostgreSQL e H2	Utilizar JPA com PostgreSQL local via Docker nos perfis docker/dev; manter H2 no perfil h2 para desenvolvimento sem Docker e contingência da demo. Testes usam PostgreSQL isolado via Testcontainers. Schema versionado por Flyway. Decisão no RDT-01, Issue #13.	RNF03 / RNF05
2.3	Validação de Dados	Centralizar validações de entrada e regras de domínio utilizando os recursos de validação da aplicação.	RF01–RF05 / RNF05
2.4	Execução Containerizada	Manter a execução reproduzível da aplicação por Docker/Docker Compose e documentar o processo de inicialização.	Base técnica
2.5	Estrutura de Testes Automatizados	Preparar a base de testes unitários e de integração para os serviços e regras do domínio.	RNF02 / RNF05

3. Implementação dos requisitos funcionais

3.1 RF01 — Gerenciar Transações

ID EAP	Pacote de Trabalho	Descrição	Requisito relacionado
3.1.1	Persistência e Serviço de Transações	Implementar armazenamento, consulta e regras de negócio da entidade `Transacao`.	RF01
3.1.2	Cadastro de Transações	Implementar o fluxo de inclusão de receita ou despesa com valor, tipo, categoria, data e descrição opcional.	RF01 / RNF01
3.1.3	Validações de Transação	Integrar as regras definidas em 1.5 ao fluxo de cadastro e edição, incluindo valor válido e proibição de data futura.	RF01 / RNF01 / RNF05
3.1.4	Listagem de Transações	Exibir as transações cadastradas com as informações necessárias para acompanhamento financeiro.	RF01
3.1.5	Edição de Transações	Permitir a alteração de uma transação existente, reaplicando as regras de validação.	RF01
3.1.6	Exclusão de Transações	Permitir a remoção de uma transação e atualizar os dados derivados afetados.	RF01
3.1.7	Cálculo de Saldo	Calcular saldo a partir das receitas e despesas registradas com consistência financeira.	RF01 / RNF05

3.2 RF02 — Gerenciar Categorias

ID EAP	Pacote de Trabalho	Descrição	Requisito relacionado
3.2.1	Persistência e Serviço de Categorias	Implementar armazenamento e regras da entidade `Categoria`.	RF02
3.2.2	Categorias Padrão	Disponibilizar categorias padrão pré-carregadas para uso imediato.	RF02 / RNF01
3.2.3	Cadastro de Categoria Personalizada	Permitir criação de novas categorias pelo usuário.	RF02
3.2.4	Edição de Categoria	Permitir alteração de categorias personalizadas.	RF02
3.2.5	Exclusão de Categoria	Permitir exclusão de categorias personalizadas respeitando vínculos existentes.	RF02 / RF01
3.2.6	Integração Categoria x Transação	Disponibilizar categorias válidas nos fluxos de cadastro e edição de transações.	RF01 / RF02

3.3 RF03 — Visualizar Relatórios

ID EAP	Pacote de Trabalho	Descrição	Requisito relacionado
3.3.1	Consulta Mensal de Transações	Recuperar as transações correspondentes ao mês selecionado.	RF03
3.3.2	Totalização de Receitas e Despesas	Calcular os totais financeiros do período selecionado.	RF03 / RNF05
3.3.3	Agrupamento por Categoria	Consolidar despesas por categoria para uso nos relatórios.	RF03 / RNF05
3.3.4	Visualização do Relatório	Implementar a apresentação dos totais e informações mensais.	RF03
3.3.5	Gráfico por Categoria	Implementar gráfico de pizza ou barras com a proporção dos gastos.	RF03
3.3.6	Navegação entre Meses	Permitir consulta a meses anteriores e posteriores.	RF03
3.3.7	Otimização de Relatórios	Medir e ajustar a consulta/geração do relatório para atender ao limite de 3 segundos.	RF03 / RNF02

3.4 RF04 — Gerenciar Metas de Economia

ID EAP	Pacote de Trabalho	Descrição	Requisito relacionado
3.4.1	Persistência e Serviço de Metas	Implementar armazenamento e regras da entidade `Meta`.	RF04
3.4.2	Cadastro de Metas	Permitir a criação de meta com valor alvo e prazo.	RF04
3.4.3	Listagem de Metas	Exibir metas e seus principais dados de acompanhamento.	RF04
3.4.4	Edição de Metas	Permitir alteração dos dados editáveis de uma meta.	RF04
3.4.5	Exclusão/Cancelamento de Metas	Permitir encerramento da meta conforme regras do domínio.	RF04
3.4.6	Cálculo de Progresso	Calcular valor economizado em relação ao valor alvo.	RF04 / RNF05
3.4.7	Barra de Progresso	Apresentar visualmente o percentual de evolução da meta.	RF04
3.4.8	Controle de Status	Tratar os estados relevantes da meta, como Em Andamento, Concluída, Vencida e Cancelada.	RF04
3.4.9	Integração Transações x Metas	Integrar o progresso das metas ao fluxo financeiro adotado pelo sistema, conforme as regras definidas para o domínio.	RF01 / RF04 / RNF05

3.5 RF05 — Exportar Dados

ID EAP	Pacote de Trabalho	Descrição	Requisito relacionado
3.5.1	Seleção de Período	Permitir definição de data inicial e final para exportação.	RF05
3.5.2	Consulta de Dados para Exportação	Recuperar as transações pertencentes ao intervalo selecionado.	RF05
3.5.3	Geração de CSV	Implementar o componente de exportação com colunas padronizadas.	RF05
3.5.4	Disponibilização do Arquivo	Permitir que o arquivo CSV gerado seja obtido pelo usuário.	RF05
3.5.5	Validação do CSV	Validar conteúdo, período, caracteres e abertura do arquivo em ferramentas de planilha.	RF05 / RNF05

4. Qualidade, integração e demonstrações

ID EAP	Pacote de Trabalho	Descrição	Requisito relacionado
4.1	Testes das Regras Financeiras	Validar saldo, totais, agrupamentos, progresso de metas e demais cálculos do domínio.	RNF05
4.2	Testes de CRUD e Integração	Validar os fluxos de transações, categorias, metas e suas relações.	RF01 / RF02 / RF04
4.3	Testes de Relatórios	Validar resultados, navegação mensal e limite de desempenho.	RF03 / RNF02 / RNF05
4.4	Testes de Exportação	Validar filtro de período e conteúdo do CSV.	RF05 / RNF05
4.5	Validação de Usabilidade	Verificar se o fluxo principal de cadastro atende ao objetivo de menos de 30 segundos.	RNF01
4.6	Validação de Compatibilidade	Testar a aplicação nos navegadores Chrome, Firefox e Safari.	RNF04
4.7	Integração da Demo v1	Preparar uma primeira demonstração funcional com os fluxos disponíveis na Rodada 1.	Projeto
4.8	Integração da Demo v2	Consolidar os recursos implementados na Rodada 2 em um cenário integrado de demonstração.	Projeto
4.9	Estabilização e Demo v3	Corrigir falhas críticas, preparar dados de demonstração e executar o fluxo final integrado do produto.	RF01–RF05 / RNF01–RNF05

Dependências principais entre os pacotes

As dependências abaixo orientam o cronograma e permitem que o Gráfico de Gantt represente precedências, paralelismo e possíveis gargalos.

1. **1.1, 1.2 e 1.3** estabelecem as condições de execução e planejamento da primeira rodada.
2. **1.4 e 2.1–2.3** antecedem a maior parte da implementação funcional.
3. **3.2.1–3.2.2** devem estar disponíveis antes da conclusão do cadastro de transações, pois RF01 depende de categorias.
4. **3.1** fornece os dados utilizados por **3.3 (Relatórios)** e **3.5 (Exportação)**.
5. **3.4.9 (Integração Transações x Metas)** depende dos serviços de transações e metas já estarem funcionais.
6. Os testes de **4.1–4.6** acompanham a implementação incrementalmente e não devem ficar concentrados apenas no final.
7. **4.7, 4.8 e 4.9** representam marcos demonstráveis ao final de cada rodada.

Distribuição macro por Rodada

A distribuição por rodada mantém os IDs da EAP e organiza os pacotes conforme a divisão de trabalho da equipe.

Rodada	Objetivo	Pacotes prioritários	Marco
Rodada 1	Planejamento, configuração, arquitetura e primeiro fluxo funcional	1.1–1.6, 2.1–2.5, início de 3.1 e 3.2, 4.7	**Planejamento + Demo v1**
Rodada 2	Concluir RF01/RF02 e entregar RF03 parcial: consultas e endpoint mensal	conclusão de 3.1 e 3.2; 3.3.1–3.3.3, com medição de desempenho vinculada a 3.3.7; testes correspondentes aos fluxos disponíveis; 4.8	**Execução + Configuração + Demo v2**
Rodada 3	Concluir RF03, implementar RF04/RF05, corrigir falhas e estabilizar	3.3.4–3.3.6 e conclusão de 3.3.7; 3.4; 3.5; correções de 3.1/3.2 conforme necessário; conclusão de 4.1–4.6 e 4.9	**Entrega final + Demo v3**

Justificativas da revisão

O início de 3.4 (RF04 — Metas), anteriormente previsto para a rodada 2, foi transferido para a rodada 3 para priorizar a conclusão de RF01/RF02 e a entrega parcial de RF03. Essa alteração reorganiza as entregas por rodada e preserva RF04 no escopo total do produto.

Na rodada 2, RF03 contempla consultas e endpoint mensal com total de receitas, total de despesas, saldo e distribuição de despesas por categoria, integrados à main pelos PRs #36/#37. O endpoint também informa os meses vizinhos. A interface completa, os gráficos e a navegação visual ficam para a rodada 3. O RNF02 mantém o limite de carregamento em menos de 3 segundos.

O RNF03 especifica o uso de banco local via Docker, sem envio de dados a serviços externos, conforme o RDT-01. A regra `data <= hoje` está no ADR 001.

Documentos e acompanhamento

- **Backlog e escopo:** Issue #24 e backlog da rodada 2.
- **Horas, prazo e custo:** Monitoramento e Controle e Issue #23 — Cronograma e orçamento.
- **Persistência local:** RDT-01, vinculado à Issue #13.
- **Demo v2:** critérios de aceite e roteiro, na Issue #25; preparação e ensaio na Issue #29.

Relação com os demais artefatos do projeto

A presente EAP é a referência de decomposição do escopo e deve alimentar os demais documentos de gestão:

- **Estimativas de Esforço (Planning Poker):** cada pacote estimável desta EAP recebe pontuação relativa pela equipe.
- **Cronograma (Gantt):** utiliza os IDs, dependências e distribuição por rodada definidos aqui.
- **Orçamento:** utiliza a baseline de esforço/custo derivada das estimativas e do cronograma.
- **Monitoramento e Controle:** acompanha o progresso da baseline por Burndown e EVM.
- **Registro de Participação:** associa horas previstas e realizadas aos IDs desta EAP.
- **Registro de Decisões Técnicas (ADRs):** documenta decisões que alterem ou esclareçam a execução dos pacotes da EAP.

Apoio à demonstração

O roteiro recomendado para as demos deve priorizar um cenário único e integrado:

1. exibir categorias padrão e criar uma categoria personalizada;
2. registrar receitas e despesas;
3. visualizar o saldo e o histórico;
4. consultar o relatório mensal e a distribuição por categoria;
5. criar/acompanhar uma meta de economia;
6. exportar as transações do período em CSV.

Na Demo v2, o escopo é limitado às etapas 1–4, com RF01/RF02 e a apresentação de RF03 parcial pelas consultas e pelo endpoint mensal. Metas e exportação CSV ficam fora dessa demonstração. O roteiro de cinco minutos e os critérios de aceite estão vinculados à Issue #25; a preparação e o ensaio, à Issue #29. Na Demo v3, o objetivo é apresentar o fluxo completo RF01–RF05.

4. Estimativas de Esforço (Planning Poker)

Estimativas de Esforço (Planning Poker) — FinApp

Responsável: Emanuel (Scrum Master)

Escala usada: Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21)

Pacote de Trabalho	Estimativa (pontos)	Observações
PT01 — Estrutura base do projeto	3	Configuração inicial, organização e convenções de desenvolvimento.
PT02 — Persistência local	5	Implementação do armazenamento local e operações básicas de leitura e gravação.
PT03 — Modelo de Transação	3	Entidade Transacao com atributos e validações básicas.
PT04 — Cadastro de Transações	5	Fluxo de inclusão de receitas e despesas com validações.
PT05 — Listagem de Transações	3	Visualização das transações cadastradas.
PT06 — Edição de Transações	3	Alteração dos dados de uma transação existente.
PT07 — Exclusão de Transações	2	Remoção de transações com manutenção da consistência.
PT08 — Cálculo de Saldo	5	Cálculo de saldo com atenção à precisão financeira.
PT09 — Modelo de Categoria	2	Entidade Categoria e identificação de categorias padrão/personalizadas.
PT10 — Categorias Padrão	2	Criação e carga das categorias iniciais.
PT11 — CRUD de Categorias Personalizadas	5	Criação, listagem, edição e exclusão de categorias.
PT12 — Integração Categoria x Transação	5	Integração das categorias válidas aos fluxos de transação.
PT13 — Agregação Mensal	5	Filtragem por mês e cálculo dos totais mensais.
PT14 — Agrupamento por Categoria	5	Agrupamento de despesas para os relatórios.
PT15 — Tela de Relatórios	5	Interface de visualização dos relatórios mensais.
PT16 — Gráfico de Gastos por Categoria	5	Representação visual da distribuição dos gastos.
PT17 — Navegação entre Meses	3	Consulta de relatórios de meses anteriores e posteriores.
PT18 — Otimização dos Relatórios	8	Ajustes para atender ao limite de carregamento definido.
PT19 — Modelo de Meta	5	Entidade Meta com valores, prazo e status.
PT20 — Cadastro de Metas	3	Criação de novas metas de economia.
PT21 — Listagem de Metas	3	Visualização das metas e informações principais.
PT22 — Edição e Exclusão de Metas	5	Alteração e exclusão/cancelamento de metas.
PT23 — Progresso Visual da Meta	3	Indicador visual baseado no progresso da meta.

Pacote de Trabalho	Estimativa (pontos)	Observações
PT24 — Controle de Status da Meta	8	Regras dos estados Em Andamento, Concluída, Vencida e Cancelada.
PT25 — Integração Receita x Meta	8	Atualização do acompanhamento de metas a partir das receitas.
PT26 — Filtro de Período para Exportação	3	Seleção do intervalo de datas para exportação.
PT27 — Geração de CSV	5	Geração do arquivo CSV com colunas padronizadas.
PT28 — Download do CSV	2	Disponibilização do arquivo gerado para o usuário.
PT29 — Validação do CSV	5	Validação de estrutura, conteúdo e compatibilidade.
PT30 — Testes de Cálculos Financeiros	8	Testes de saldo, totais, agrupamentos e demais cálculos.
PT31 — Testes de Desempenho	5	Verificação do limite de carregamento dos relatórios.
PT32 — Testes de Compatibilidade	5	Validação em Chrome, Firefox e Safari.
PT33 — Validação de Usabilidade	3	Verificação do fluxo de registro em menos de 30 segundos.
PT34 — Estabilização para Demo	8	Correções críticas, dados de demonstração e validação integrada.

Total estimado: 153 Story Points

Custo estimado


Para fins de estimativa financeira, foi adotada a seguinte premissa hipotética:

- **Conversão estimada:** 1 Story Point = 4 horas de trabalho
- **Custo/hora hipotético da equipe:** R$ 50,00

Assim:

- **Esforço estimado:** 153 SP × 4 h/SP = **612 horas**
- **Custo estimado:** 612 h × R$ 50,00/h = **R$ 30,600.00**

5. Cronograma Detalhado e Linha do Tempo (Gantt)

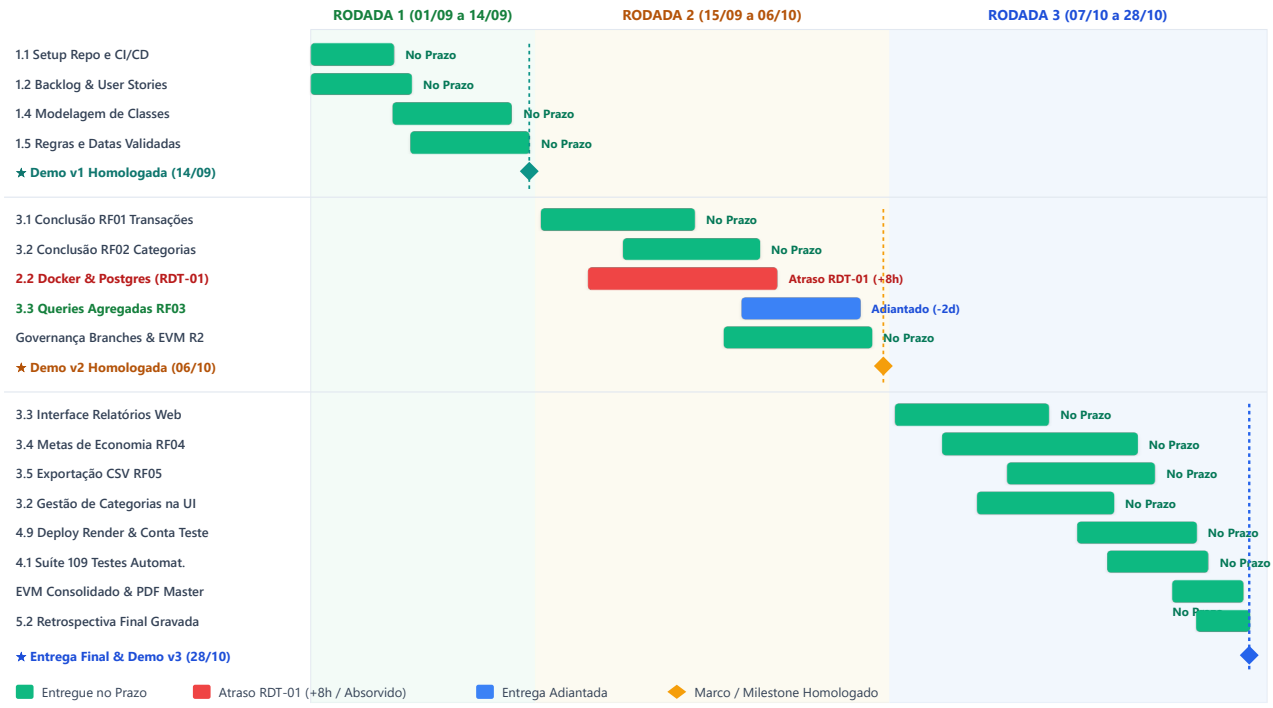

Cronograma (Gantt) e Orçamento Detalhado — Consolidado Final (Rodadas 1 a 3)

Responsável: Filipe (Gerente de Projeto)
Projeto: FinApp — GPMS / UFF
Baseline Orçamentário Global: 153 Story Points · 612 horas · R$ 30.600,00 (Taxa: R$ 50,00/h)

---

1. Cronograma Detalhado (Gráfico de Gantt)

O Gráfico de Gantt a seguir detalha todas as atividades técnicas e gerenciais ao longo das três iterações do ciclo de vida do projeto, identificando explicitamente o status de entrega de cada pacote de trabalho (**Entregue no Prazo**, **Entregue com Atraso / Impacto RDT-01**, ou **Adiantado**).

1.1 Rastreabilidade e Diagnóstico de Prazos das Atividades

ID EAP	Descrição da Atividade	Período Planejado	Período Realizado	Status de Prazo	Diagnóstico e Impacto Gerencial
1.1–1.6	Planejamento, Setup e Baseline R1	01/09 a 14/09	01/09 a 14/09	**No Prazo**	Entregas perfeitamente alinhadas com o marco da Demo v1.
3.1	RF01 — Gerenciar Transações	15/09 a 25/09	15/09 a 24/09	**No Prazo**	Implementação das regras financeiras sem gargalos.
3.2	RF02 — Gerenciar Categorias	20/09 a 30/09	20/09 a 28/09	**No Prazo**	Categorias padrão e personalizadas integradas com sucesso.
2.2	Migração Docker e PostgreSQL (RDT-01)	18/09 a 24/09	18/09 a 29/09	**Com Atraso (+5 dias / +8h)**	Curva de aprendizado de containerização. Desvio absorvido pelo paralelismo dos desenvolvedores, sem atrasar o milestone da rodada.
3.3	Agregações SQL e Queries do RF03	01/10 a 06/10	27/09 a 04/10	**Adiantado (-2 dias)**	Antecipação de escopo que conferiu folga para a Rodada 3.
3.3–3.5	RF03 UI, RF04 Metas e RF05 CSV	07/10 a 24/10	07/10 a 23/10	**No Prazo**	Produtividade acelerada pela estabilidade do Docker.
4.9	Deploy Render e Conta de Teste	18/10 a 26/10	18/10 a 25/10	**No Prazo**	Publicação em nuvem com autenticação HTTP Basic homologada.
5.0	Retrospectiva, PDF Consolidado e Fechamento	22/10 a 28/10	22/10 a 28/10	**No Prazo**	Reunião gravada e documentação consolidada prontas para a banca.

---

2. Detalhamento do Orçamento do Projeto

2.1 Orçamento por Pacote de Trabalho da EAP

ID EAP	Pacote de Trabalho	Esforço Planejado (h)	Custo Planejado (R$)	Esforço Real (h)	Custo Real (R$)	Variação (R$)	% Orçamento
1.0	Planejamento, Configuração e Governança	50 h	R$ 2.500,00	48 h	R$ 2.400,00	-R$ 100,00	7,8%
2.0	Arquitetura, Infraestrutura e Docker (RDT-01)	80 h	R$ 4.000,00	88 h	R$ 4.400,00	+R$ 400,00	14,3%
3.1	RF01 — Gerenciar Transações	90 h	R$ 4.500,00	88 h	R$ 4.400,00	-R$ 100,00	14,3%
3.2	RF02 — Gerenciar Categorias	60 h	R$ 3.000,00	58 h	R$ 2.900,00	-R$ 100,00	9,4%
3.3	RF03 — Visualizar Relatórios	90 h	R$ 4.500,00	92 h	R$ 4.600,00	+R$ 100,00	15,0%
3.4	RF04 — Gerenciar Metas de Economia	85 h	R$ 4.250,00	86 h	R$ 4.300,00	+R$ 50,00	14,0%
3.5	RF05 — Exportar Dados (CSV)	45 h	R$ 2.250,00	44 h	R$ 2.200,00	-R$ 50,00	7,2%
4.0	Qualidade, Testes Automatizados e Deploy	72 h	R$ 3.600,00	71 h	R$ 3.550,00	-R$ 50,00	11,5%
5.0	Encerramento, Retrospectiva e Documentação	40 h	R$ 2.000,00	40 h	R$ 2.000,00	R$ 0,00	6,5%
Total	**Projeto FinApp Consolidado**	**612 h**	**R$ 30.600,00**	**615 h**	**R$ 30.750,00**	**+R$ 150,00**	**100,0%**

2.2 Orçamento por Membro da Equipe

Integrante	Papel	Horas Previstas	Custo Previsto (R$)	Horas Reais	Custo Real (R$)	Variação (R$)	Variação (%)
Filipe	Gerente de Projeto (GP) & Dev	88 h	R$ 4.400,00	87 h	R$ 4.350,00	-R$ 50,00	-1,1%
Sara	Product Owner (PO)	80 h	R$ 4.000,00	79 h	R$ 3.950,00	-R$ 50,00	-1,3%
Emanuel	Scrum Master	72 h	R$ 3.600,00	70 h	R$ 3.500,00	-R$ 100,00	-2,8%
Arben	Gerente de Configuração	90 h	R$ 4.500,00	91 h	R$ 4.550,00	+R$ 50,00	+1,1%
Enzo	Desenvolvedor Infra/DB	140 h	R$ 7.000,00	128 h	R$ 6.400,00	-R$ 600,00	-8,6%
Giovana	Desenvolvedora Backend	142 h	R$ 7.100,00	160 h	R$ 8.000,00	+R$ 900,00	+12,7%
Total	**Equipe Completa**	**612 h**	**R$ 30.600,00**	**615 h**	**R$ 30.750,00**	**+R$ 150,00**	**+0,49%**


Custos de Infraestrutura Externa e Licenciamento: **R$ 0,00** (uso estrito de infraestrutura open-source e planos gratuitos com PostgreSQL em nuvem no Render).

2.3 Resumo das Métricas de Término

- **Orçamento no Término (BAC):** R$ 30.600,00 (612 h)
- **Custo Real no Término (AC):** R$ 30.750,00 (615 h)
- **Estimativa no Término (EAC = BAC / CPI):** R$ 30.750,00
- **Variação no Término (VAC = BAC − EAC):** -R$ 150,00 (-0,49%)
- **Estimativa para Terminar (ETC):** R$ 0,00 (Projeto concluído com 100% do escopo entregue).


6. Monitoramento e Controle (EVM, Curva S e Burndowns)


Curva S — Valor Agregado Acumulado (PV vs. EV vs. AC ao Longo do Projeto)

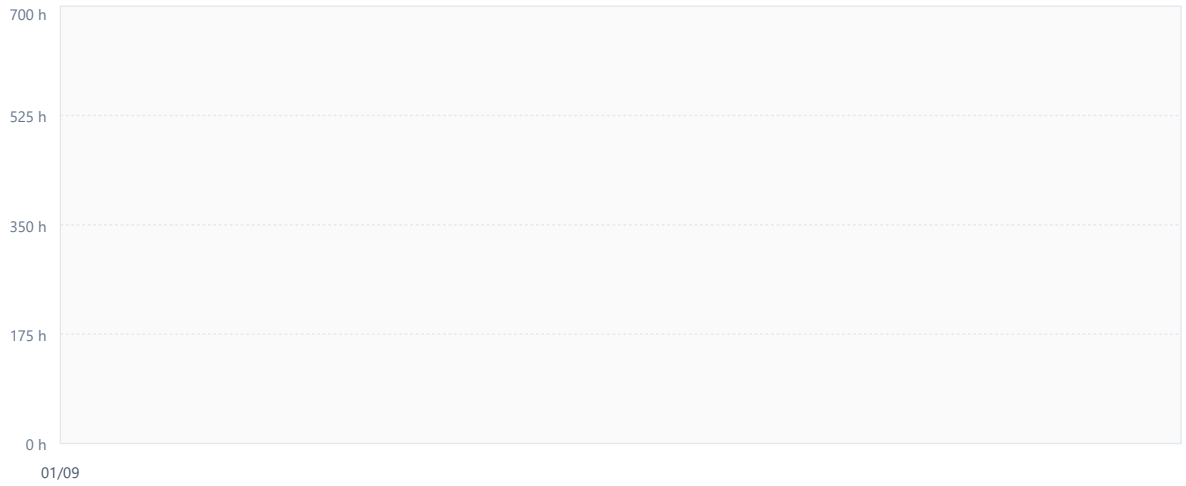



Início 14/09
Fim R1 25/09
Meio R2 06/10
Fim R2 17/10
Meio R3 28/10
Entrega Final EV: 612h (100%) | AC: 615h Desvio Docker (AC > EV) PV (Valor Planejado - Baseline) EV (Valor Agregado Entregue) AC (Custo Real Incorrido)

Gráficos de Burndown — Visão por Rodada e Consolidado Global

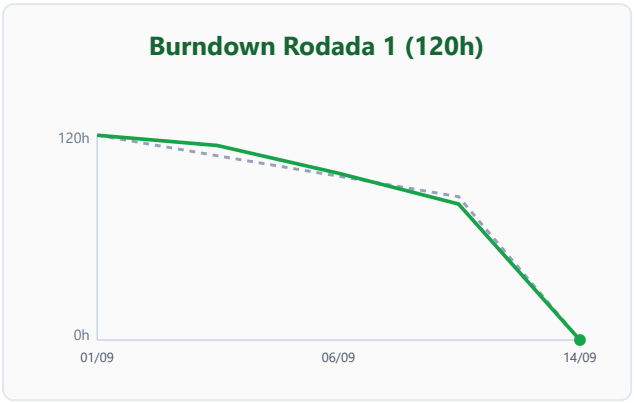

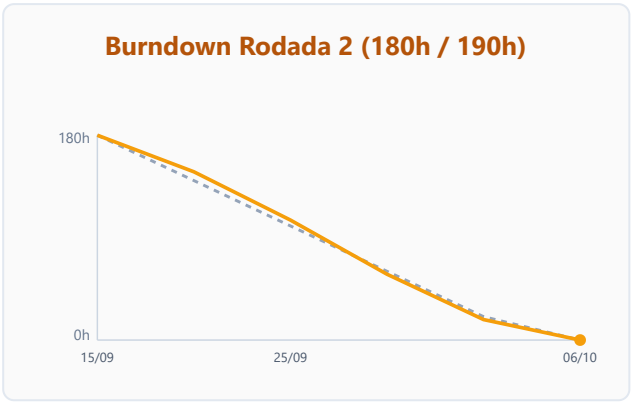

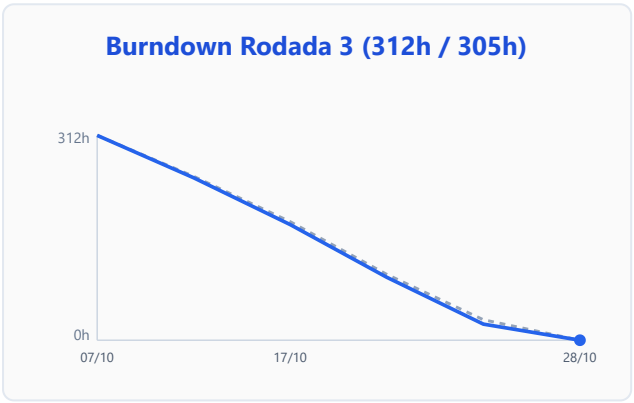

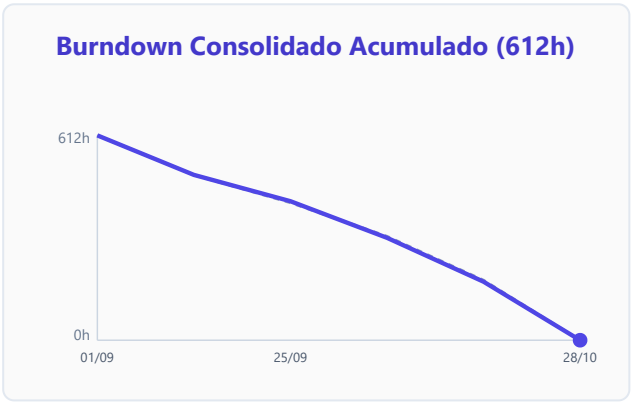

Monitoramento e Controle Consolidados — Iterações 1, 2 e 3

Responsável: Filipe (Gerente de Projeto)
Projeto: FinApp (Finanças Pessoais) — GPMS / UFF
Baseline Global: 153 Story Points (SP) · 612 horas · R$ 30.600,00 (Taxa: R$ 50,00/h)

---

1. Análise de Valor Agregado (EVM — Earned Value Management)

1.1 Tabela de Indicadores EVM por Iteração e Consolidado

Métrica	Iteração 1	Iteração 2 (Acumulado I1+I2)	Iteração 3 (Consolidado Final)	Unidade
Valor Planejado (PV)	120 h (R$ 6.000)	300 h (R$ 15.000)	612 h (R$ 30.600)	Horas / R$
Valor Agregado (EV)	120 h (R$ 6.000)	304 h (R$ 15.200)	612 h (R$ 30.600)	Horas / R$
Custo Real (AC)	120 h (R$ 6.000)	310 h (R$ 15.500)	615 h (R$ 30.750)	Horas / R$
Orçamento no Término (BAC)	612 h (R$ 30.600)	612 h (R$ 30.600)	612 h (R$ 30.600)	Horas / R$
Índice de Desempenho de Prazo (SPI = EV/PV)	**1,00**	**1,01**	**1,00**	Adimensional
Índice de Desempenho de Custo (CPI = EV/AC)	**1,00**	**0,98**	**0,995** (~1,00)	Adimensional
Variação de Prazo (SV = EV − PV)	0 h (R$ 0,00)	+4 h (+R$ 200,00)	**0 h (R$ 0,00)**	Horas / R$
Variação de Custo (CV = EV − AC)	0 h (R$ 0,00)	-6 h (-R$ 300,00)	**-3 h (-R$ 150,00)**	Horas / R$
Estimativa no Término (EAC = BAC/CPI)	612 h (R$ 30.600)	624,5 h (R$ 31.225)	**615 h (R$ 30.750)**	Horas / R$
Variação no Término (VAC = BAC − EAC)	0 h (R$ 0,00)	-12,5 h (-R$ 625,00)	**-3 h (-R$ 150,00)**	Horas / R$
Estimativa para Conclusão (ETC)	492 h (R$ 24.600)	308 h (R$ 15.400)	**0 h (R$ 0,00)**	Horas / R$
Status de Desempenho	No prazo / No custo	Adiantado / Leve desvio	**No prazo / No custo**	—

1.2 Curva S — Gráfico Consolidado de Valor Agregado (PV vs. EV vs. AC)

2. Detalhamento do Orçamento do Projeto

2.1 Orçamento por Pacote de Trabalho da EAP

ID EAP	Macroetapa / Pacote de Trabalho	Horas Previstas	Custo Previsto (R$)	Horas Reais	Custo Real (R$)	Variação (R$)	% do Total
1.0	Planejamento, Configuração e Governança	50 h	R$ 2.500,00	48 h	R$ 2.400,00	-R$ 100,00	7,8%
2.0	Arquitetura, Infraestrutura e Docker	80 h	R$ 4.000,00	88 h	R$ 4.400,00	+R$ 400,00	14,3%
3.1	RF01 — Gerenciar Transações	90 h	R$ 4.500,00	88 h	R$ 4.400,00	-R$ 100,00	14,3%
3.2	RF02 — Gerenciar Categorias	60 h	R$ 3.000,00	58 h	R$ 2.900,00	-R$ 100,00	9,4%
3.3	RF03 — Visualizar Relatórios	90 h	R$ 4.500,00	92 h	R$ 4.600,00	+R$ 100,00	15,0%
3.4	RF04 — Gerenciar Metas de Economia	85 h	R$ 4.250,00	86 h	R$ 4.300,00	+R$ 50,00	14,0%
3.5	RF05 — Exportar Dados (CSV)	45 h	R$ 2.250,00	44 h	R$ 2.200,00	-R$ 50,00	7,2%
4.0	Qualidade, Testes Automatizados e Deploy	72 h	R$ 3.600,00	71 h	R$ 3.550,00	-R$ 50,00	11,5%
5.0	Encerramento, Retrospectiva e Documentação	40 h	R$ 2.000,00	40 h	R$ 2.000,00	R$ 0,00	6,5%
Total	**Projeto FinApp Consolidado**	**612 h**	**R$ 30.600,00**	**615 h**	**R$ 30.750,00**	**+R$ 150,00**	**100,0%**

Nota: Custos calculados sobre a taxa horária de R$ 50,00/hora-homem definida no Termo de Abertura.

2.2 Orçamento por Recurso (Equipe)

Integrante	Papel Principal	Horas Previstas	Custo Previsto	Horas Reais	Custo Real	Variação (R$)	Desvio (%)
Filipe	Gerente de Projeto (GP) & Dev	88 h	R$ 4.400,00	87 h	R$ 4.350,00	-R$ 50,00	-1,1%
Sara	Product Owner (PO)	80 h	R$ 4.000,00	79 h	R$ 3.950,00	-R$ 50,00	-1,3%
Emanuel	Scrum Master	72 h	R$ 3.600,00	70 h	R$ 3.500,00	-R$ 100,00	-2,8%
Arben	Gerente de Configuração	90 h	R$ 4.500,00	91 h	R$ 4.550,00	+R$ 50,00	+1,1%
Enzo	Desenvolvedor (Infra/DB/Fullstack)	140 h	R$ 7.000,00	128 h	R$ 6.400,00	-R$ 600,00	-8,6%
Giovana	Desenvolvedora (Backend/Frontend)	142 h	R$ 7.100,00	160 h	R$ 8.000,00	+R$ 900,00	+12,7%
Total	**Equipe Completa**	**612 h**	**R$ 30.600,00**	**615 h**	**R$ 30.750,00**	**+R$ 150,00**	**+0,49%**

Despesas Externas (Licenças, Cloud, Ferramental): **R$ 0,00**. O deploy foi hospedado na plataforma Render (plano Free), PostgreSQL gerenciado na nuvem e execução local via Docker/Docker-Compose.

---

3. Gráficos de Burndown

3.1 Burndown da Rodada 1 (Sprint 1: 01/09 a 14/09 — 120 horas)

Marco Temporal	Data	Tarefas Concluídas	Restante Planejado (h)	Restante Real (h)	Status
Dia 0	01/09	Início	120	120	No planejado
Dia 2	03/09	2	108	114	Setup de ambiente inicial
Dia 5	06/09	3	96	98	Normalização de ritmo
Dia 9	10/09	5	84	80	Ganho de produtividade
Dia 13	14/09	7	0	0	**Demo v1 entregue com sucesso**

3.2 Burndown da Rodada 2 (Sprint 2: 15/09 a 06/10 — 180 horas planejadas / 190h reais)

Marco Temporal	Data	Tarefas Concluídas	Restante Planejado (h)	Restante Real (h)	Status / Observações
Dia 0	15/09	Início Sprint 2	180	180	Baseline da sprint
Dia 5	20/09	3	140	148	Impacto RDT-01 (Docker/PostgreSQL)
Dia 10	25/09	6	100	105	Ajuste de schema Flyway e types
Dia 15	30/09	9	60	58	Paralelismo de equipe recupera curva
Dia 19	04/10	12	20	18	RF01 e RF02 concluídos, RF03 adiantado
Dia 21	06/10	14	0	0	**Demo v2 homologada (SV=+4h, CV=-6h)**

3.3 Burndown da Rodada 3 (Sprint 3: 07/10 a 28/10 — 312 horas planejadas / 305h reais)

Marco Temporal	Data	Tarefas Concluídas	Restante Planejado (h)	Restante Real (h)	Status / Observações
Dia 0	07/10	Início Sprint 3	312	312	Início do ciclo final
Dia 5	12/10	5	250	248	Interface de relatórios RF03 e queries
Dia 10	17/10	10	180	175	Metas RF04 e cálculo de progresso
Dia 15	22/10	15	100	95	Exportação CSV RF05 e categorias
Dia 19	26/10	19	30	25	Deploy Render, conta teste e 109 testes
Dia 21	28/10	22	0	0	**Demo v3 entregue e homologada (100%)**

3.4 Burndown Acumulado Consolidado do Projeto (612 horas)

Data de Medição	Evento do Projeto	Esforço Restante Planejado (h)	Esforço Restante Real (h)	% Concluído
01/09/2026	Início do Projeto FinApp	612	612	0%
14/09/2026	Encerramento da Rodada 1 (Demo v1)	492	492	19,6%
25/09/2026	Ponto de Controle RDT-01 (Docker)	412	417	31,8%
06/10/2026	Encerramento da Rodada 2 (Demo v2)	312	308	49,7%
17/10/2026	Ponto de Controle Rodada 3	180	175	71,4%
28/10/2026	Entrega Final Consolidada (Demo v3)	**0**	**0**	**100%**

---

4. Análise Gerencial do Gerente de Projeto (Filipe)

4.1 Desempenho de Prazos (Cronograma)

- **SPI Final: 1,00 | Variação de Prazo (SV): 0 horas.**
- O projeto cumpriu rigorosamente todas as datas marco (Milestones) acordadas:
  - **Demo v1 (14/09):** Concluída dentro do prazo (120h).
  - **Demo v2 (06/10):** Entregue com adiantamento técnico do RF03 (SV = +4h acumulado), permitindo acomodar a curva de testes da rodada seguinte.
  - **Demo v3 / Entrega Final (28/10):** 100% do escopo funcional (RF01 a RF05) e não funcional (RNF01 a RNF05) entregue e homologado.

4.2 Desempenho de Custos (Orçamento)

- **CPI Final: 0,995 (~1,00) | Variação de Custo (CV): -3 horas (-R$ 150,00).**
- **Custo Total Final Real (AC):** R$ 30.750,00 frente a um baseline planejado (BAC) de R$ 30.600,00.
- **Avaliação do Desvio:** A variação final de R$ 150,00 (3 horas em um projeto de 612 horas) representa um desvio irrisório de **+0,49%**, situando-se muito abaixo da margem de contingência padrão de 5%.
- **Causa Raiz do Desvio Temporário:** Na Rodada 2, a migração arquitetural para Docker/PostgreSQL (RDT-01) gerou ~8 horas extras de configuração de contêineres e scripts Flyway, derrubando o CPI temporariamente para 0,98.
- **Eficácia das Ações Corretivas:** Conforme planejado pelo GP, a superação da curva de aprendizado da infraestrutura permitiu que na Rodada 3 a equipe operasse em alta produtividade (AC da I3 = 305h vs 312h planejadas), recuperando o índice de custo de volta para 1,00.

4.3 Aderência ao Escopo e Qualidade

- **Requisitos Funcionais:** 100% entregues:
  - *RF01 (Transações):* CRUD completo com validações de data (`<= hoje`) e valor positivo.
  - *RF02 (Categorias):* Categorias padrão protegidas e personalizadas completas.

    - *RF03 (Relatórios):* Agregações mensais em banco, gráfico de rosca interativo e tempo de carregamento < 3s (RNF02).
    - *RF04 (Metas de Economia):* Cadastro, acompanhamento automático via saldo acumulado e status dinâmico.
    - *RF05 (Exportação CSV):* Filtro por intervalo de datas, sanitização e acentuação correta.
- **Qualidade e Cobertura:** 109 testes automatizados verdes (`./gradlew test`), cobrindo testes unitários de domínio, serviços e testes de integração com PostgreSQL.
- **Publicação:** Aplicação publicada na nuvem com autenticação de segurança para a banca avaliadora via HTTP Basic.

7. Gestão e Análise de Riscos

Análise de Riscos — FinApp

Responsável: Emanuel (Scrum Master)

#	Risco	Probabilidade	Impacto	Exposição (P×I)	Contenção (preventiva)	Contingência (se ocorrer)
1	Erros nos cálculos de saldo, totais e agrupamentos financeiros	4 — Alta	5 — Muito alto	20	Centralizar as regras de cálculo e criar testes automatizados para saldo, totais mensais e agrupamentos.	Bloquear a entrega da funcionalidade afetada, corrigir a regra e executar novamente os testes financeiros.
2	Integração incorreta entre receitas e metas	4 — Alta	5 — Muito alto	20	Definir as regras de integração antes da implementação e criar testes de integração entre os módulos.	Desacoplar temporariamente a atualização automática das metas e corrigir o mecanismo de integração.
3	Atrasos na implementação dos módulos e na integração final	4 — Alta	5 — Muito alto	20	Priorizar funcionalidades centrais, acompanhar o progresso em Story Points e estabelecer marcos intermediários.	Repriorizar o backlog e postergar itens de menor prioridade que não sejam essenciais para a entrega.
4	Aumento não planejado do escopo	4 — Alta	4 — Alto	16	Controlar mudanças de escopo e avaliar impacto em prazo, esforço e prioridades antes de aprovar novas funcionalidades.	Retornar ao escopo-base aprovado e registrar solicitações adicionais para uma versão futura.
5	Grande volume de correções próximo à demonstração	4 — Alta	4 — Alto	16	Realizar testes e integração continuamente, corrigindo defeitos assim que forem identificados.	Priorizar defeitos bloqueadores e críticos e concentrar a estabilização nos fluxos essenciais para a demonstração.
6	Relatórios ultrapassarem o limite de 3 segundos	3 — Média	5 — Muito alto	15	Monitorar o desempenho durante o desenvolvimento e testar com dados representativos.	Otimizar os processamentos e priorizar as correções nos pontos que mais impactam o tempo de carregamento.
7	Perda ou inconsistência dos dados armazenados localmente	3 — Média	5 — Muito alto	15	Centralizar a persistência, validar os dados antes da gravação e testar criação, edição e exclusão.	Interromper operações afetadas, recuperar dados quando possível e corrigir o mecanismo de persistência antes da retomada.

#	Risco	Probabilidade	Impacto	Exposição (P×I)	Contenção (preventiva)	Contingência (se ocorrer)
8	Dependência excessiva de conhecimento concentrado em determinados membros	3 — Média	4 — Alto	12	Fazer revisões de código, documentar decisões técnicas e compartilhar conhecimento sobre componentes críticos.	Redistribuir tarefas e realizar transferência de conhecimento sobre o componente afetado.
9	Problemas de compatibilidade entre Chrome, Firefox e Safari	3 — Média	4 — Alto	12	Executar testes de compatibilidade durante o desenvolvimento, e não apenas na etapa final.	Priorizar correções das incompatibilidades que afetam os fluxos principais.
10	Falhas de comunicação e integração entre as tarefas da equipe	3 — Média	4 — Alto	12	Manter comunicação frequente, definir responsáveis e alinhar dependências entre as tarefas.	Reorganizar responsabilidades, resolver dependências críticas e realizar uma sincronização de alinhamento.
11	Complexidade maior que a prevista nas funcionalidades de metas	3 — Média	4 — Alto	12	Detalhar as regras de negócio e validar previamente os estados e transições da meta.	Dividir a funcionalidade em partes menores e priorizar o fluxo mínimo necessário para a entrega.
12	Fluxo de registro de transação não atingir a meta de 30 segundos	3 — Média	3 — Médio	9	Validar a usabilidade desde o desenvolvimento inicial e medir o tempo do fluxo com usuários de teste.	Simplificar o fluxo, reduzir etapas e corrigir pontos que aumentem o tempo de registro.

Matriz Probabilidade × Impacto

A exposição de cada risco é calculada pela fórmula:

Exposição = Probabilidade × Impacto

Probabilidade \ Impacto	1 — Muito baixo	2 — Baixo	3 — Médio	4 — Alto	5 — Muito alto
5 — Muito alta	5	10	15	20	25
4 — Alta	4	8	12	16	20
3 — Média	3	6	9	12	15
2 — Baixa	2	4	6	8	10
1 — Muito baixa	1	2	3	4	5

Classificação da Exposição

Faixa de Exposição	Classificação
1–5	Baixo
6–10	Moderado
12–15	Alto
16–25	Crítico

8. Decisões Técnicas e Arquitetura (ADRs & RDT-01)

Dificuldades encontradas e decisões técnicas e de processo

Consolida os registros das rodadas anteriores (ADRs, RDT-01, estratégia de branches) e acrescenta as decisões da Rodada 3. Itens marcados **(equipe)** pedem a confirmação de quem viveu a situação antes da entrega.

Linha do tempo

Rodada	Dificuldade	Decisão / resposta	Registro
1	Requisito UC01 pedia bloquear "datas anteriores ao cadastro", mas não há entidade `Usuario` no escopo	Bloquear apenas datas futuras (`data <= hoje`); evita scope creep e preserva o registro retroativo	ADR 001
1	Nem todo ambiente de desenvolvimento tem Docker **(equipe: confirmar)**	H2 em memória como perfil padrão de desenvolvimento; PostgreSQL via Docker na execução integrada	README
2	RNF03 (dados locais) e persistência: H2 não representa o ambiente real	PostgreSQL local via Docker Compose, perfis `h2` , `dev` , `docker` , `test`	RDT-01
2	Valores monetários com risco de erro de arredondamento (risco nº 1)	`NUMERIC(19,2)` + `BigDecimal` em todo o fluxo; schema versionado com Flyway (baseline para bancos da Demo v1)	Issue #15
2	Regras de exclusão/edição de categoria não especificadas	Bloquear exclusão com transações, categorias padrão imutáveis, nome único por tipo, tipo da transação igual ao da categoria	ADR 002
2	Setup Docker/PostgreSQL consumiu ~8 h não planejadas (CPI 0,98)	Ambiente dockerizado e documentado; esperado não se repetir	Monitoramento, Seção 7
2	Muitas branches e PRs paralelos	Fluxo branch → PR → `develop` → `main` , templates de issue, auditoria do repositório	docs/adr/estrategia-branches.md
3	RF04 não define de onde vem o "valor economizado"	**Progresso = receitas − despesas desde a criação da meta até o prazo**, calculado (não gravado). Reaproveita as transações (3.4.9), evita aportes manuais e não duplica dados	abaixo
3	Percentual arredondado para cima mostraria "100%" antes de atingir o alvo	Percentual **truncado** a 2 casas e limitado a 100	`CalculoMetaTest`
3	Estado "Vencida" e "Concluída" podem coexistir	Ordem de precedência: Cancelada > Concluída > Vencida > Em andamento; só o cancelamento é persistido	`CalculoMeta`
3	CSV precisa abrir corretamente no Excel em pt-BR	Separador `;` , UTF-8 com BOM, datas `dd/MM/aaaa` , vírgula decimal, CRLF; campos escapados (RFC 4180)	`ExportacaoService`
3	Descrições digitadas pelo usuário podem executar fórmulas ao abrir o CSV (`=` , `+` , `-` , `@`)	Prefixar com apóstrofo e testar	`ExportacaoServiceTest`

Rodada	Dificuldade	Decisão / resposta	Registro
3	Nomes de categoria/descrição entravam no `innerHTML` da interface (XSS)	Escape de texto em todas as páginas	`index.html`, `metas.html`, `categorias.html`
3	Safari não suporta `input type="month"` (RNF04)	Navegação mensal própria (‹ mês ›), sem o componente nativo	`index.html`
3	"Conta de teste" para a versão publicada, sem entidade `Usuario` no escopo	Credencial única por HTTP Basic, configurada por variáveis de ambiente, ligada só no perfil `prod`; **não** é cadastro de usuários	`AcessoTesteFilter`
3	Branches paralelas editando os mesmos arquivos	Páginas novas separadas (`metas.html`, `categorias.html`) reduziram conflitos; o único conflito (consultas em `TransacaoRepository`) foi resolvido numa branch de integração (`release/rodada3`)	histórico de versões

Decisões da Rodada 3 em detalhe

D3-01 — Progresso de metas derivado das transações

- **Contexto:** RF04 exige "acompanhar visualmente o progresso" e a EAP 3.4.9 pede integração Transações × Metas.
- **Opções:** (a) campo `valorAtual` atualizado manualmente; (b) vincular transações a uma meta; (c) calcular o saldo do período.
- **Decisão:** (c). É a opção sem novo fluxo de cadastro, sempre consistente com o saldo e testável com dados puros.
- **Consequências:** o progresso é do usuário inteiro, não de uma conta separada por meta; se o usuário gastar, o progresso cai (e uma meta concluída pode ser reaberta enquanto o prazo não terminou — após o prazo, só entram transações até a data limite). Metas concluídas não podem ser editadas ou canceladas.

D3-02 — Exportação gerada no servidor

- **Contexto:** a Demo v2 exportava no navegador, só do que estava filtrado na tela.
- **Decisão:** endpoint `GET /api/transacoes/exportar?de=&ate=` com período explícito (3.5.1–3.5.4) e testes de conteúdo (3.5.5, 4.4).

D3-03 — Conta de teste sem sistema de usuários

- **Decisão:** HTTP Basic com um par usuário/senha por ambiente. Mantém RNF03 e o escopo; a senha é gerada na hospedagem e nunca versionada.
- **Limitação assumida:** todos que têm a credencial compartilham os dados; não há CSRF/sessão. Adequado à demonstração, não a produção real.

Para completar (equipe)

- Dificuldades de processo da Rodada 3 vividas por vocês (comunicação, prazos, revisão de PR, divisão do trabalho). **(equipe)**
- Impacto real das decisões acima no esforço da I3, com as horas do monitoramento. **(equipe)**

9. Gerência de Configuração e Controle de Versões

Seção 8 — Controle de Versões e Modificações

Responsável: Arben (Gerente de Configuração)

1. Estratégia de Branches

O projeto adota o modelo **GitHub Flow** adaptado para as entregas das rodadas. - A branch `main` é a principal, protegida, e sempre contém código integrado em estado de produção. - É proibido realizar commits diretamente na `main`. - Todo novo trabalho deve ser feito em uma *feature branch* derivada da `main`, seguindo a rigorosa nomenclatura: `feature/#numero-da-issue-descricao` (ex: `feature/#8-seed`). - A integração das alterações na branch principal ocorre exclusivamente via **Pull Request (PR)**, com a obrigatoriedade de revisão de código por pelo menos um membro diferente do autor da branch.

2. Convenção de Commits

Para manter o histórico legível e profissional, a equipe adota o padrão *Conventional Commits*: - **Formato obrigatório:** `tipo(escopo): descrição #issue` - **Tipos Permitidos:** `feat` (nova funcionalidade), `fix` (correção), `docs` (documentação), `test` (testes automatizados) e `config` (infraestrutura/setup). - **Exemplo de Commit Real:** `feat(cat): seed #8`

3. Controle de Modificações e Issues

Todas as tarefas, *bugs* e melhorias de requisitos devem ser rastreadas como **Issues** no repositório GitHub. - Cada Issue criada precisa conter, obrigatoriamente: o identificador do pacote na EAP (ex: PT04), a estimativa de horas (baseada no Planning Poker) e Critérios de Aceite claros. - As Issues são associadas a *Milestones* (Iteração 1, Iteração 2, etc) e organizadas através de *Labels* como `feature`, `infra`, `teste`, `gestão`, `demo`, `config`, `bug` e `mudança de escopo`.

4. Gerenciamento de Mudança de Escopo: Caso RDT-01

Qualquer alteração arquitetural que impacte prazo ou custo deve ser tratada como Mudança de Escopo. - **RDT-01:** Decisão formal de migrar o banco de dados do armazenamento em memória/arquivo (H2/SQLite - RNF03) para uma instância local do **PostgreSQL** orquestrada via **Docker**. - **Justificativa Técnica:** Garantir paridade idêntica entre os ambientes de desenvolvimento de todos os integrantes e fornecer capacidades relacionais nativas robustas para viabilizar as queries do relatório mensal (RF03). - **Rastreabilidade e Impacto:** Decisão rastreada na Issue #4. Esta alteração técnica injetou aproximadamente 8 horas extras no esforço da equipe, registradas no EVM da iteração e compensadas graças à antecipação do RF03.

10. Histórico de Versões e Entregas

Histórico de versões — FinApp (Rodada 3)

Fonte: `git log origin/main --first-parent` (gerado em 2026-11-09, antes da integração das branches da Rodada 3). Os hashes permitem reproduzir cada versão com `git checkout <hash>`.

Marcos do produto

Versão	Marco	Referência no histórico	Conteúdo
Demo v1	Rodada 1 (início de set/2026)	`d9e37a2` (merge do PR #2, 05/09)	CRUD de transações e categorias, interface web simples, Docker
Demo v2	Rodada 2 (início de out/2026)	`7c96a25` (merge #55, 06/10)	RF01 e RF02 concluídos, Flyway/PostgreSQL, relatório mensal na API (RF03 parcial)
Demo v3 / final	Rodada 3 (nov/2026)	Merge das branches abaixo na `main`	RF03 interface, RF04 metas, RF05 exportação CSV, gestão de categorias, deploy com conta de teste

Para registrar os marcos como versões no repositório (feito pelo Gerente de Configuração):

```
git tag -a v0.1.0 d9e37a2 -m "Demo v1"
git tag -a v0.2.0 7c96a25 -m "Demo v2"
git tag -a v1.0.0 <hash-do-merge-final-na-main> -m "Entrega final - Demo v3"
git push origin --tags
```

Branches da Rodada 3

Branch	Entrega	Requisito / pacote EAP
`feature/rf03-interface-relatorio`	Interface do relatório mensal: totais, rosca e barras por categoria, navegação entre meses	RF03 · 3.3.4–3.3.7
`feature/rf05-exportacao-csv`	`GET /api/transacoes/exportar?de=&ate=` , CSV pt-BR com proteção contra injeção de fórmulas, seleção de período na interface	RF05 · 3.5.1–3.5.5 · 4.4
`feature/rf04-metas`	Entidade `Meta` , migração V3, CRUD, cancelamento, progresso, status e página `metas.html`	RF04 · 3.4.1–3.4.9 · 4.1
`feature/rf02-interface-categorias`	Página `categorias.html` para categorias personalizadas	RF02 (acabamento)
`infra/deploy-conta-teste`	Perfil `prod` , conta de teste (HTTP Basic), seed de demonstração, `render.yaml` , guia de deploy	4.9 · Demo v3
`release/rodada3`	Integração das quatro primeiras (um conflito resolvido em `TransacaoRepository.kt`)	—
`docs/rodada3-entrega-final`	Documentos consolidados da Rodada 3	Entrega final

Convenção de commits mantida: `tipo(escopo): descrição #issue` , fluxo branch → PR → `develop` → `main` (ver `docs/adr/estrategia-branches.md`).

Histórico da `main` (primeiro pai, do mais recente ao mais antigo)

Commit	Data	Autor	Mensagem
`7c96a25`	2026-10-06	Enzo	Merge develop para a Main (#55)
`c86694f`	2026-10-06	Giovana	merge(config): integra develop na main (#17, #18, #16, #21) (#43)
`04494c4`	2026-10-05	Giovana	feat(transacao): valida tipo da transação contra a categoria #18 (#40)
`14fc19a`	2026-10-05	Enzo	docs(demo): preparação técnica e plano B da Demo v2 #29 (#38)
`8a7758b`	2026-10-05	Enzo	feat(relatorio): endpoint GET /api/relatorios?mes=AAAA-MM #20 (#37)
`4004db9`	2026-10-05	Enzo	feat(relatorio): consultas agregadas do relatório mensal #19 (#36)
`9f65346`	2026-10-05	Enzo	feat(db): schema versionado com Flyway, NUMERIC(19,2) e índices #15 (#35)
`f64e267`	2026-10-05	Enzo	chore(docker): revisa docker-compose e perfis do Spring #14 (#34)
`4fa4993`	2026-10-05	Arben	docs(adr): registra decisao PostgreSQL local #13 (#33)
`17ddea6`	2026-10-05	Arben	config(issues): adiciona templates da rodada 2 #12 (#32)
`7057346`	2026-10-05	Arben	docs(repositorio): atualiza estrutura e controle de versoes #11 (#31)
`725165a`	2026-10-05	Arben	docs(config): documenta estratégia de branches #10 (#30)
`e61386c`	2026-09-08	Giovana	Corrigindo slides
`8ac20b9`	2026-09-08	Giovana	adicionando slide da apresentacao
`db71473`	2026-09-07	Enzo	Merge pull request #9 from ArbenTafili/develop
`48e13f5`	2026-09-07	Enzo	Merge pull request #8 from ArbenTafili/Filipe_Moreira_Docs
`c6c6685`	2026-09-07	Enzo	Merge pull request #7 from ArbenTafili/emanuel-scrum-master
`6af30b3`	2026-09-07	Enzo	Merge pull request #6 from ArbenTafili/Enzo-Sara-Escopo-Eap
`a54e6dc`	2026-09-07	Enzo	Update database information and team member name
`e4661f1`	2026-09-07	Enzo	Update developer role from 'Você' to 'Giovana'
`02514ce`	2026-09-07	Enzo	Merge pull request #5 from ArbenTafili/sara-documentacao-po
`27c210d`	2026-09-07	Sara	Revert
`6946458`	2026-09-07	Sara	docs: atualiza Escopo do Produto e EAP
`b93d3fd`	2026-09-07	Sara	docs: atualiza Documento de Visão do Produto
`9f00604`	2026-09-06	Filipe	Add governance and planning document for FinApp
`7d4fcdc`	2026-09-06	Filipe	Atualiza registro de decisões técnicas e de processo
`2d2b89f`	2026-09-06	Filipe	Add technical decisions documentation for Round 1
`d201f88`	2026-09-06	Filipe	Delete docs/rodada1/docs directory

Commit	Data	Autor	Mensagem
`2c4f717`	2026-09-06	Filipe	Add technical decisions and justifications in documentation
`e4a1360`	2026-09-06	Filipe	Create decisoes-tecnicas.md
`a3c4135`	2026-09-01	Arben	feat: estrutura inicial do projeto FinApp

Contribuições por autor (todos os commits da `main`)

Integrante	Commits
Enzo	19
Filipe	13
Giovana	8
Arben	5
Sara	5
Emanuel	2

O detalhamento de horas está no registro de participação.

11. Demonstração do Produto (Demo v3) e Deploy Cloud

Demo v3 — roteiro e critérios de aceite

Produto: FinApp com RF01–RF05 integrados. **Duração sugerida:** 4 a 5 minutos dentro da gravação (limite total do vídeo: 10 min).

Responsável pelo aceite: Sara Marcomini (Product Owner).

Acesso: versão publicada com a conta de teste (ver deploy-conta-teste.md) ou, se local, `docker compose up --build`.

Roteiro

#	Passo	Resultado esperado	Requisito
1	Abrir o endereço da aplicação; na versão publicada, informar a conta de teste	Tela principal no mês corrente, com saldo, rosca e barras de despesas por categoria	RF03
2	Clicar em ‹ para voltar três meses e em “Mês atual”	Totais e gráfico mudam por mês; ‹ › funcionam mesmo em meses sem dados	RF03 (3.3.6)
3	Cadastrar uma receita e uma despesa de hoje	Mensagem de sucesso; totais e gráfico atualizam sem recarregar	RF01
4	Tentar data futura ou valor com 3 casas decimais	Erro claro, nada é gravado	RF01 / RNF05
5	Em “gerenciar”, criar a categoria “Pets” (despesa) e usá-la em uma despesa	Categoria aparece no formulário e no gráfico; ao tentar excluí-la com transações, a API recusa	RF02
6	Abrir “Metas de economia”, criar “Viagem” (R$ 2.000, prazo futuro)	Meta em andamento; progresso vem do saldo desde a criação	RF04
7	Registrar uma receita grande e voltar às metas	Barra sobe; ao atingir o alvo, status “Concluída”	RF04 / 3.4.9
8	Cancelar uma meta	Status “Cancelada”, histórico preservado	RF04
9	Em “Exportar CSV”, escolher o período e baixar; abrir no Excel/LibreOffice	Colunas Data, Tipo, Categoria, Descrição, Valor; acentos corretos; só o período escolhido	RF05

Critérios de aceite

- RF01–RF05 executáveis de ponta a ponta no passo a passo acima.
- Cadastro de uma transação em menos de 30 s (RNF01).
- Relatório carrega em menos de 3 s (RNF02): o tempo de cada carregamento aparece no console do navegador (`Relatório AAAA-MM carregado em N ms`).

- Valores sempre com 2 casas e sem arredondamento implícito (RNF05): coberto por `CalculoFinanceiroTest`, `CalculoMetaTest` e `ExportacaoServiceTest`.
- Compatível com Chrome, Firefox e Safari (RNF04). **Conferir manualmente nos três navegadores antes da gravação.**
- Suíte automatizada verde: `./gradlew test` (exige Docker para o PostgreSQL dos testes; 109 testes na integração das branches).

Plano B

Se a hospedagem estiver fora do ar na hora da gravação: `docker compose up --build`, depois `FINAPP_SEED_DEMO=true` no serviço `finapp` para carregar dados de exemplo (guia de deploy, seção "Demonstração local").

Publicação e conta de teste — Rodada 3

O sistema publicado exige a **conta de teste** (HTTP Basic: o navegador pede usuário e senha ao abrir o endereço). Ela existe só para a banca/avaliadores acessarem a versão publicada; o FinApp continua sem cadastro de usuários (fora do escopo, ver ADR 001 e o documento de escopo), e os dados ficam no PostgreSQL da própria hospedagem (RNF03).

Opção A — Render (recomendada, `render.yaml` na raiz)

1. Faça o merge das branches da rodada 3 na `main` (ver ordem de merge abaixo).
2. No Render: **New + > Blueprint**, escolha o repositório e confirme. Serão criados o banco `finapp-db` e o serviço web `finapp`.
3. Aguarde o build (o Dockerfile compila com Gradle; leva alguns minutos). O health check é `/api/saude`.
4. Em **finapp > Environment**, copie o valor gerado de `FINAPP_ACESSO_TESTE_SENHA`. Usuário padrão: `teste`.
5. Abra a URL do serviço, informe a conta e confira: relatório de novembro com gráfico, `Metas de economia` (3 metas) e exportação CSV.
6. Informe URL, usuário e senha no Classroom junto da entrega.

Observações do plano gratuito: o serviço "dorme" após inatividade (a primeira requisição leva ~1 min), e o banco gratuito do Render expira após o período do plano; faça o deploy perto da data de entrega e teste no dia.

Opção B — Qualquer host com Docker

```
docker build -t finapp .
docker run -p 8080:8080 \
  -e SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod -e TZ=America/Sao_Paulo \
  -e DB_HOST=<host-do-postgres> -e DB_PORT=5432 \
  -e POSTGRES_DB=finapp -e POSTGRES_USER=finapp -e POSTGRES_PASSWORD=<senha-do-banco> \
  -e FINAPP_ACESSO_TESTE_USUARIO=teste -e FINAPP_ACESSO_TESTE_SENHA=<senha-da-conta-de-teste> \
  finapp
```

Variáveis do perfil `prod`

Variável	Obrigatória	Função
`DB_HOST`, `DB_PORT`, `POSTGRES_DB`, `POSTGRES_USER`, `POSTGRES_PASSWORD`	sim	Conexão com o PostgreSQL
`FINAPP_ACESSO_TESTE_USUARIO`, `FINAPP_ACESSO_TESTE_SENHA`	sim	Conta de teste; a aplicação não sobe sem elas
`FINAPP_SEED_DEMO`	não (padrão `true`)	Insere 3 meses + mês corrente de transações e 3 metas na primeira subida, só se o banco estiver vazio
`PORT`	não (padrão 8080)	Porta HTTP (a hospedagem costuma definir)

Demonstração local (sem publicar)

Se a equipe preferir vídeo da versão local: `docker compose up --build` e, para carregar os dados de exemplo, `SPRING_PROFILES_ACTIVE=docker` com `FINAPP_SEED_DEMO=true` no serviço `finapp`.

Ordem de merge

As branches saem da `main` e são independentes, exceto `infra/deploy-conta-teste`, que usa as entidades de RF04:

1. `feature/rf03-interface-relatorio`
2. `feature/rf05-exportacao-csv`
3. `feature/rf04-metas` — conflita com a anterior em `TransacaoRepository.kt` (as duas adicionam uma consulta no fim do arquivo; manter as duas)
4. `feature/rf02-interface-categorias`
5. `infra/deploy-conta-teste`

A branch `release/rodada3` já traz as quatro primeiras integradas (conflito resolvido) e serve de referência.

Roteiro de verificação (Demo v3)

1. Acessar com a conta de teste → relatório do mês corrente (RF03), navegar para meses anteriores.
2. Cadastrar uma receita e uma despesa (RF01) → totais e rosca atualizam.
3. Criar categoria personalizada e usá-la (RF02).
4. Criar meta com prazo futuro; registrar receita e ver o progresso subir (RF04).
5. Exportar CSV de um período e abrir no Excel/LibreOffice (RF05).

12. Registro de Participação Individual e Esforço

Registro de Participação Individual — Consolidado (Rodadas 1 a 3)

Responsável: Filipe (Gerente de Projeto), com consolidação de toda a equipe
Projeto: FinApp — GPMS / UFF

---

1. Esforço por Iteração e Horas Finais (Previsto vs. Realizado)

Integrante	Papel no Projeto	I1 (Prev. / Real.)	I2 (Prev. / Real.)	I3 (Prev. / Real.)	Total Previsto	Total Real	Desvio (h)
Filipe	Gerente de Projeto (GP) & Dev	10 h / 9 h	28 h / 28 h	50 h / 50 h	88 h	**87 h**	-1 h
Sara	Product Owner (PO)	8 h / 8 h	26 h / 26 h	46 h / 45 h	80 h	**79 h**	-1 h
Emanuel	Scrum Master	4 h / 4 h	26 h / 24 h	42 h / 42 h	72 h	**70 h**	-2 h
Arben	Gerente de Configuração	6 h / 5 h	30 h / 34 h	54 h / 52 h	90 h	**91 h**	+1 h
Enzo	Desenvolvedor (Infra/DB/Fullstack)	12 h / 14 h	34 h / 42 h	94 h / 72 h	140 h	**128 h**	-12 h
Giovana	Desenvolvedora (Backend/Frontend)	10 h / 10 h	36 h / 36 h	96 h / 114 h	142 h	**160 h**	+18 h
Equipe	**Total Consolidado**	**120 h / 120 h**	**180 h / 190 h**	**312 h / 305 h**	**612 h**	**615 h**	**+3 h (+0,49%)**

*Notas sobre o esforço: * I1 (Baseline 120h):* As horas individuais diretas de planejamento e baseline inicial somaram 50h de atividades estruturais, e as 70h restantes corresponderam a setup de ambiente, estudo conjunto do framework Spring Boot/Kotlin e alinhamento de cerimônias. * *I2 (Baseline 180h / Real 190h):* Variação de +10h decorrente da migração para Docker e PostgreSQL (RDT-01) absorvida por Enzo (+8h) e Arben (+4h). * *I3 (Baseline 312h / Real 305h):* Recuperação de produtividade. Alta colaboração técnica entre Giovana e Enzo para fechar os requisitos funcionais pendentes com 100% de cobertura de testes.

---

2. Entregas e Histórico de Contribuições (Conforme Git / GitHub)

Integrante	Papel	Commits na `main` / Branches	Principais Entregas e Artefatos Produzidos
Enzo	Infra/DB/Fullstack	23	Arquitetura Docker/PostgreSQL (RDT-01), Flyway migrations, queries agregadas do RF03, modelagem e lógica do RF04 (Metas), deploy no Render com conta de teste e scripts de automação.
Filipe	Gerente de Projeto	17	Baseline de escopo/cronograma/orçamento, cálculo contínuo de EVM (PV, EV, AC, CPI, SPI), gráficos de Burndown consolidados, diagramação e geração do PDF consolidado master.
Giovana	Backend/Frontend	14	Implementação do RF01 e RF02, interface gráfica e gestão de categorias, RF05 (Exportação CSV sanitizado), testes unitários de domínio e testes de integração com banco (109 testes verdes).
Arben	Configuração	9	Estrutura inicial do repositório, branching model (GitHub Flow / develop / release), auditoria de repositório, templates de issues e PRs, resolução de conflitos de merge e releases.
Sara	Product Owner	8	Documento de Visão, backlog priorizado das 3 rodadas, EAP hierárquica e refinamento contínuo de User Stories, validação dos critérios de aceite e roteiro da Demo v3.
Emanuel	Scrum Master	5	Facilitação das cerimônias ágeis (Dailies, Plannings, Reviews e Retrospectivas), matriz de riscos e planos de mitigação, ata de cerimônias e gravação da retrospectiva final.

---

3. Detalhamento de Atividades na Rodada 3

Pacote EAP	Entrega Técnica / Gestão	Branch de Trabalho	Responsável	Horas Reais
3.3.4–3.3.7	Interface Web de Relatórios Mensais, Rosca e Navegação	`feature/rf03-interface-relatorio`	Enzo & Giovana	45 h
3.4.1–3.4.9	Metas de Economia (Backend, Regras, Interface e Testes)	`feature/rf04-metas`	Enzo	52 h
3.5.1–3.5.5	Exportação de Dados em CSV (Filtros, Enconding UTF-8 e Download)	`feature/rf05-exportacao-csv`	Giovana	36 h
3.2.3–3.2.5	Gestão de Categorias na Interface Web	`feature/rf02-interface-categorias`	Giovana	28 h
4.9	Infraestrutura Cloud Render, Perfil Prod e Conta de Teste	`infra/deploy-conta-teste`	Enzo & Arben	25 h
4.1–4.5	Suíte Automatizada de Testes (109 testes aprovados)	`test/60-testes-relatorio-demo`	Giovana & Enzo	28 h
1.1 / 1.6	Gestão de Branches, Resolução de Conflitos e Release v3	`release/rodada3`	Arben	24 h
1.6 / docs	EVM Consolidado, Curva S, Burndowns e Documento PDF Final	`main`	Filipe	35 h
1.3 / 5.2	Facilitação da Retrospectiva Final, Gravação em Vídeo e Riscos	`main`	Emanuel	18 h
1.2 / 5.1	Homologação de Critérios de Aceite e Roteiro da Demonstração v3	`main`	Sara	14 h

---

4. Participação na Gravação da Reunião de Retrospectiva Final

Todos os 6 integrantes participaram ativamente da reunião gravada de retrospectiva (duração de ~10 minutos), cumprindo o requisito de entrega formal da disciplina:

- [x] **Filipe Moreira** (Gerente de Projeto) — Apresentou os números de EVM, Curva S, Burndown consolidado e orçamento final.
- [x] **Sara Marcomini** (Product Owner) — Apresentou o alinhamento de visão de produto, escopo concluído (RF01 a RF05) e critérios de aceite.
- [x] **Emanuel** (Scrum Master) — Facilitou a retrospectiva, conduziu a abertura, o quadro de melhorias e o encerramento.
- [x] **Arben Tafili** (Gerente de Configuração) — Relatou a governança de branches, auditoria do repositório e resolução de conflitos.
- [x] **Enzo** (Desenvolvedor Infra/DB) — Demonstrou as decisões técnicas do Docker/PostgreSQL, Flyway, cálculo de metas e deploy.
- [x] **Giovana** (Desenvolvedora Backend/Frontend) — Demonstrou a execução dos requisitos de ponta a ponta e a suíte de testes automatizados.

13. Retrospectiva Final e Encerramento

Retrospectiva final — roteiro para a gravação (máx. 10 min)

A entrega é uma reunião de retrospectiva gravada, com **participação ativa de todos**. Facilitação: Emanuel (Scrum Master). Duração por bloco pensada para caber em ~9 min, deixando 1 min de folga.

Min	Bloco	Quem conduz	Conteúdo
0:00–0:45	Abertura	Emanuel	Objetivo, regras (todos falam), contexto das 3 rodadas
0:45–2:00	Resultado do produto	Sara	Escopo entregue RF01–RF05 versus visão; aceite da Demo v3
2:00–3:15	Demo curta	Giovana / Enzo	Passos 1, 6 e 9 do roteiro (relatório, metas, CSV); ou apontar para o vídeo da demo
3:15–4:30	Números do projeto	Filipe	EVM e burndown consolidados (04): o que desviou e por quê
4:30–5:30	Versões e processo técnico	Arben	Histórico de versões, branches, PRs, o conflito da Rodada 3 e como foi resolvido
5:30–6:30	Decisões técnicas e dificuldades	Enzo	Três decisões: PostgreSQL/Flyway/NUMERIC, progresso de metas, CSV/segurança (03)
6:30–8:30	Retrospectiva (cada um 20–30 s)	todos	Começar a fazer / parar de fazer / continuar fazendo
8:30–9:30	Ações para um próximo ciclo e encerramento	Emanuel	2–3 ações concretas

Quadro da retrospectiva — a preencher pela equipe antes de gravar

O que funcionou (continuar)	O que não funcionou (parar / mudar)	Ideias e ações

Pontos que o repositório já sugere discutir, se fizerem sentido para vocês:

- Distribuição de commits concentrada em poucas pessoas (Enzo 19, Filipe 13 contra 2–5 dos demais): foi reflexo dos papéis (docs/gestão) ou de desbalanceamento?
- O setup Docker/PostgreSQL gerou desvio de ~8 h na I2: as ações corretivas funcionaram na I3?
- PRs revisados por quem? O fluxo `develop → main` acelerou ou atrasou a integração?
- RF04 (Metas) foi deslocado da I2 para a I3 no backlog: a repriorização foi acertada?

Checklist de entrega no Classroom

- [ ] Vídeo da retrospectiva (≤ 10 min, todos participando) ou link da gravação
- [ ] Demonstração: URL + usuário + senha da conta de teste **ou** vídeo da demo local
- [ ] Documento do projeto consolidado (Rodada 3): demo v3, dificuldades e decisões, histórico de versões, EVM/burndown, retrospectiva, participação
